





График для работы																												
Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	% завершения	Кв. 3, 2025			Кв. 4, 2025			Кв. 1, 2026			Кв. 2, 2026			Кв. 3, 2026			Кв. 4, 2026			Кв. 1, 2027			Кв. 2, 2027	
						Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар		Апр
1	Основные вехи проекта	589 дней?	Пт 01.08.25	Пт 12.03.27	56%																							56%
2	Основные вехи	510 дней	Пн 01.09.25	Сб 23.01.27	0%																							0%
3	Дата начала работ по проекту	0 дней	Пн 01.09.25	Пн 01.09.25	0%																							
4	Завершение базового проекта (Завершено)	0 дней	Пн 01.09.25	Пн 01.09.25	0%																							
5	Завершение разработки детального проекта (РД) в полном объеме	0 дней	Чт 16.04.26	Чт 16.04.26	0%																							
6	Завершение подготовки основания (зона ответственности Заказчика, условие начала общестроительных работ)	0 дней	Сб 20.06.26	Сб 20.06.26	0%																							
7	Начало общестроительных работ в Зоне сжигания серы и конверсии (112)	0 дней	Вс 19.04.26	Вс 19.04.26	0%																							
8	Завершение возведения каркаса административно-бытового корпуса (141)	0 дней	Сб 25.04.26	Сб 25.04.26	0%																							
9	Отгрузка первой партии оборудования	0 дней	Пн 20.04.26	Пн 20.04.26	0%																							
10	Доставка на площадку оборудования с длительным сроком изготовления — теплотехническое оборудование	0 дней	Чт 16.07.26	Чт 16.07.26	0%																							
11	Доставка на площадку оборудования с длительным сроком изготовления — воздуходувка (основной нагнетатель	0 дней	Пт 31.07.26	Пт 31.07.26	0%																							
12	Доставка на площадку оборудования с длительным циклом изготовления — паротурбинная установка (турбогенератор)	0 дней	Чт 13.08.26	Чт 13.08.26	0%																							
13	Завершение строительно-монтажных работ и начало пусконаладочных испытаний в зоне товарных резервуаров серной кислоты	0 дней	Пн 21.12.26	Пн 21.12.26	0%																							
14	Завершение возведения строительных конструкций здания ТЭС-утилизатора (115)	0 дней	Сб 15.08.26	Сб 15.08.26	0%																							
15	Завершение монтажа корпуса контактного аппарата (112)	0 дней	Чт 15.10.26	Чт 15.10.26	0%																							
16	Обеспечение готовности подачи технической воды (зона ответственности	0 дней	Сб 16.01.27	Сб 16.01.27	0%																							
17	Обеспечение готовности подачи электроэнергии (зона ответственности Заказчика)	0 дней	Ср 13.01.27	Ср 13.01.27	0%																							
18	Обеспечение готовности подачи природного газа (зона ответственности	8 дней	Пт 15.01.27	Пт 22.01.27	0%																							
19	Готовность к комплексному пуску на рабочих средах / подаче сырья	0 дней	Сб 23.01.27	Сб 23.01.27	0%																							
20																												
21	Базовый проект	14 дней	Пн 01.09.25	Пн 15.09.25	100%																							
22	Выпуск опросных листов на оборудование с длительным сроком изготовления (Завершено)	0 дней	Пн 01.09.25	Пн 01.09.25	100%																							
23	Разработка и внутреннее рассмотрение базового проекта (Завершено)	0 дней	Пн 01.09.25	Пн 01.09.25	100%																							
24	Перевод базового проекта и передача на рассмотрение Заказчику (Завершено)	0 дней	Пн 01.09.25	Пн 01.09.25	100%																							


Стр. 1

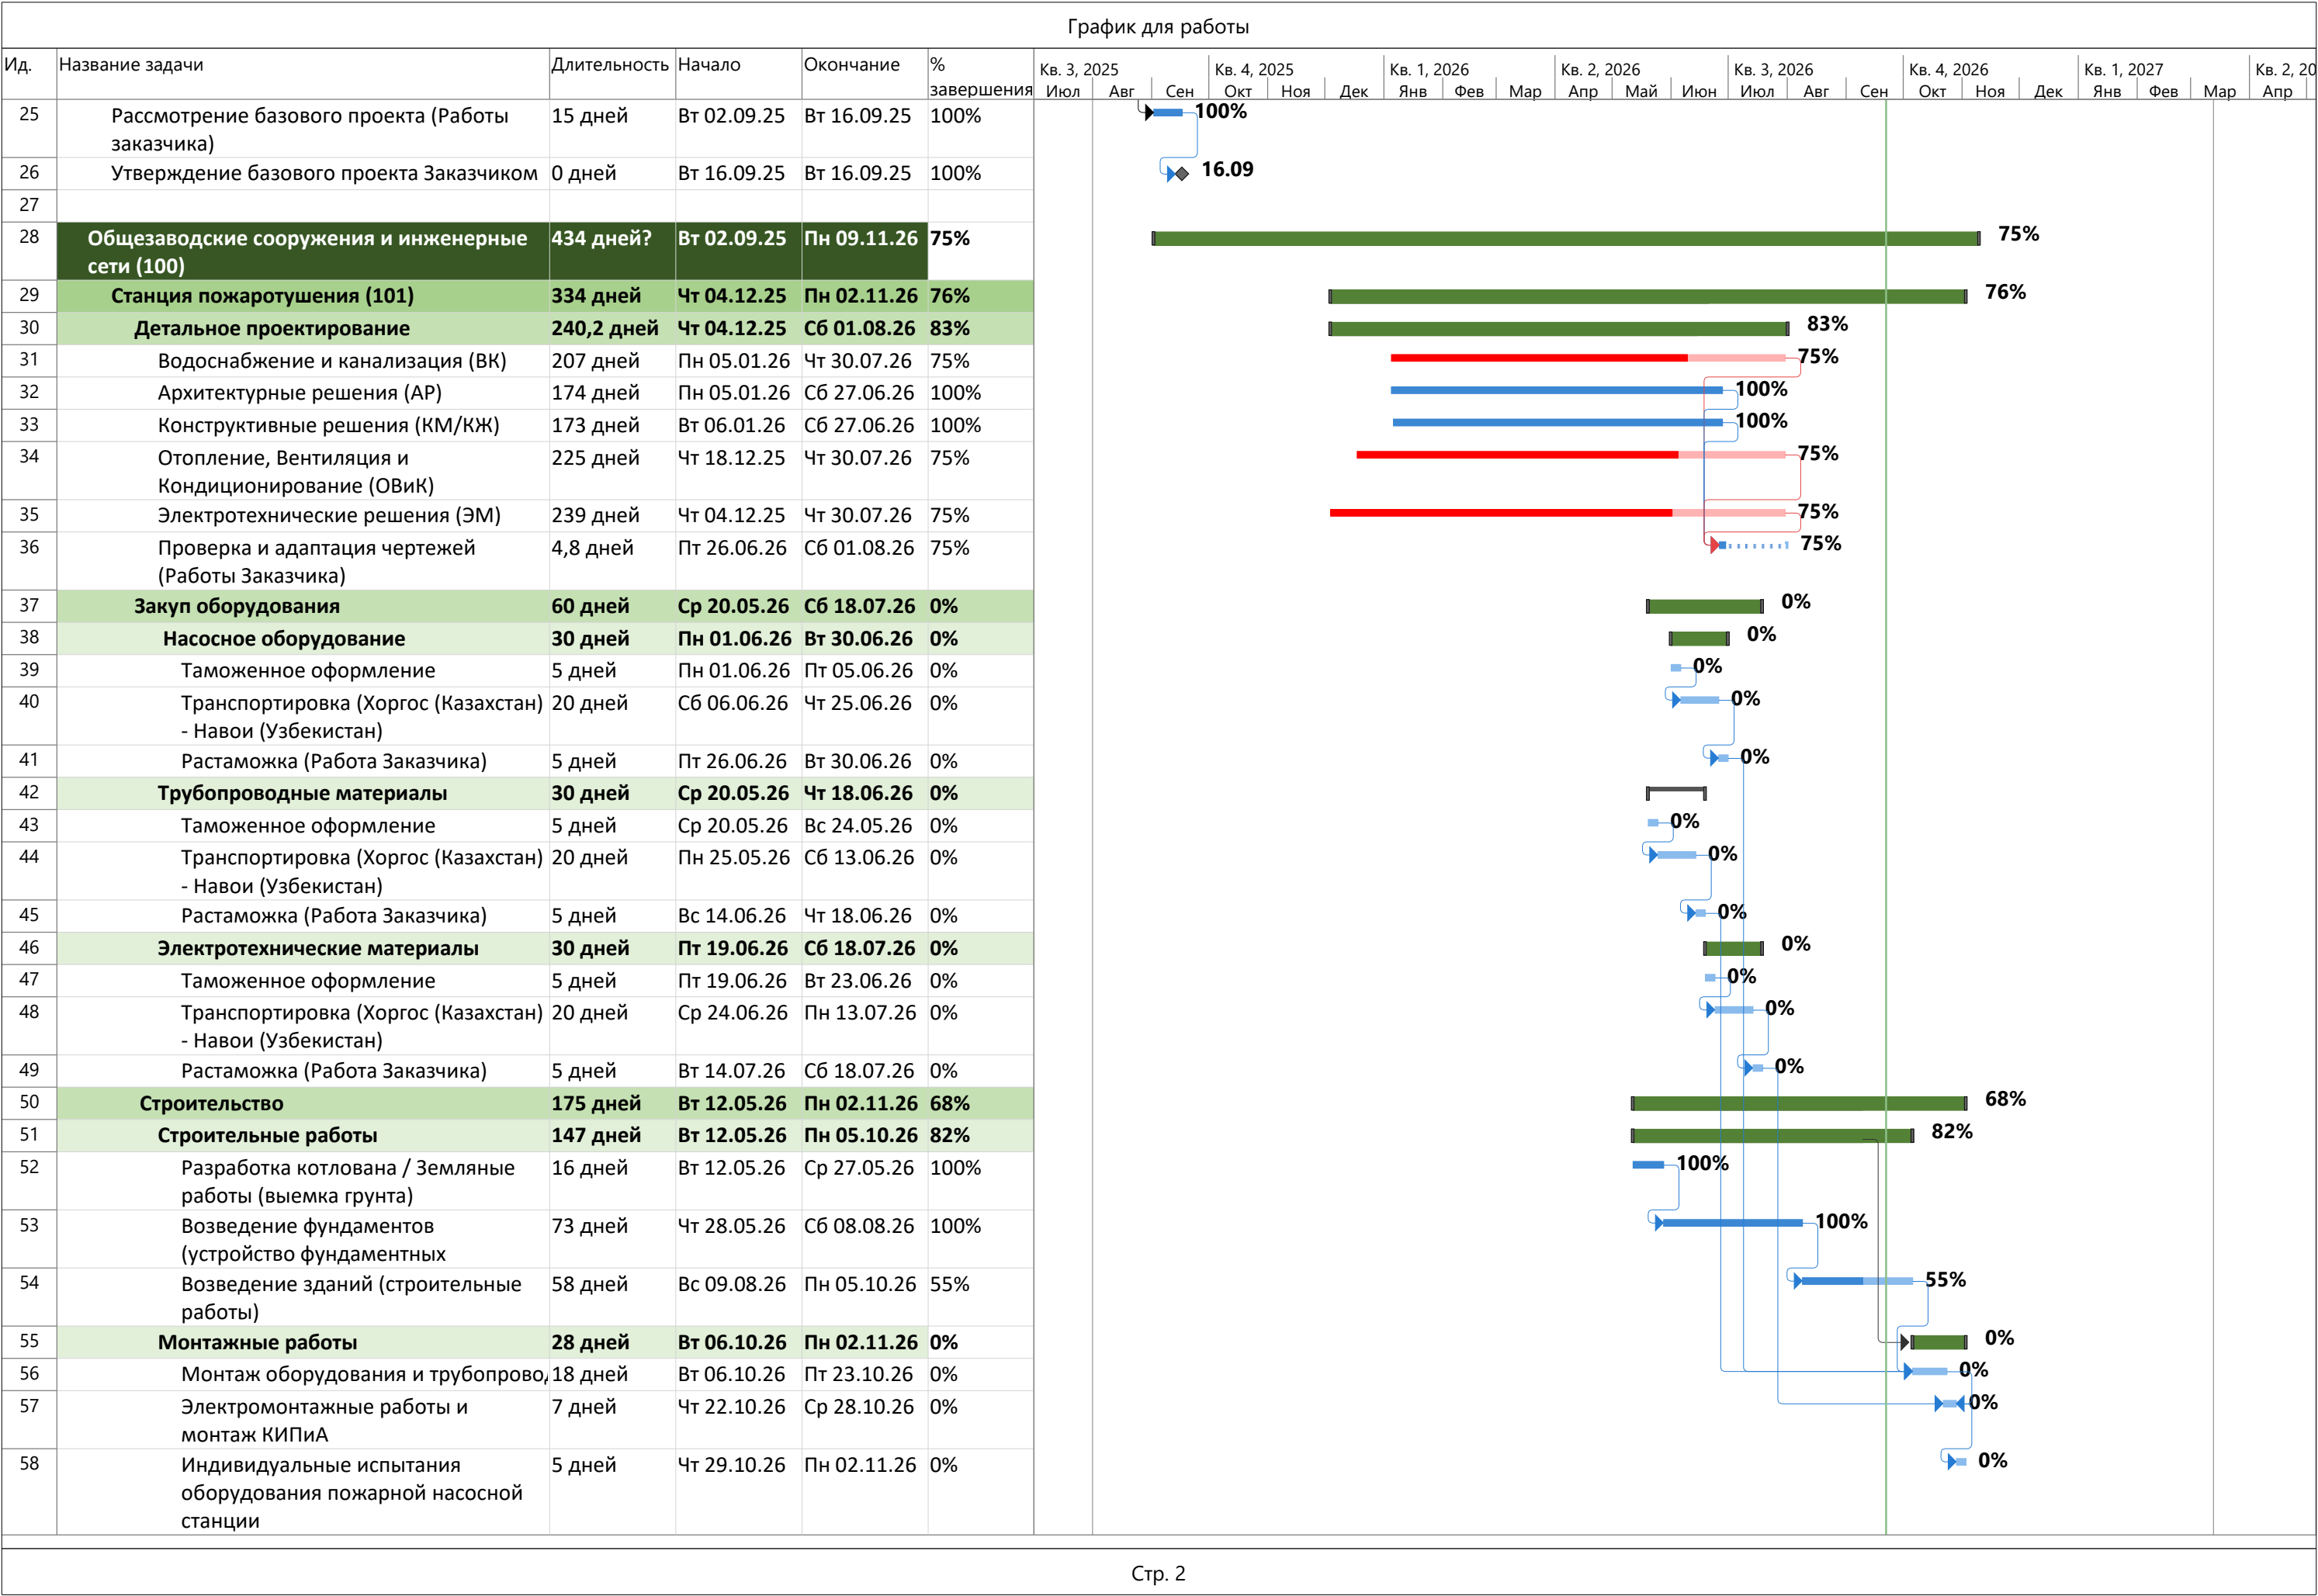


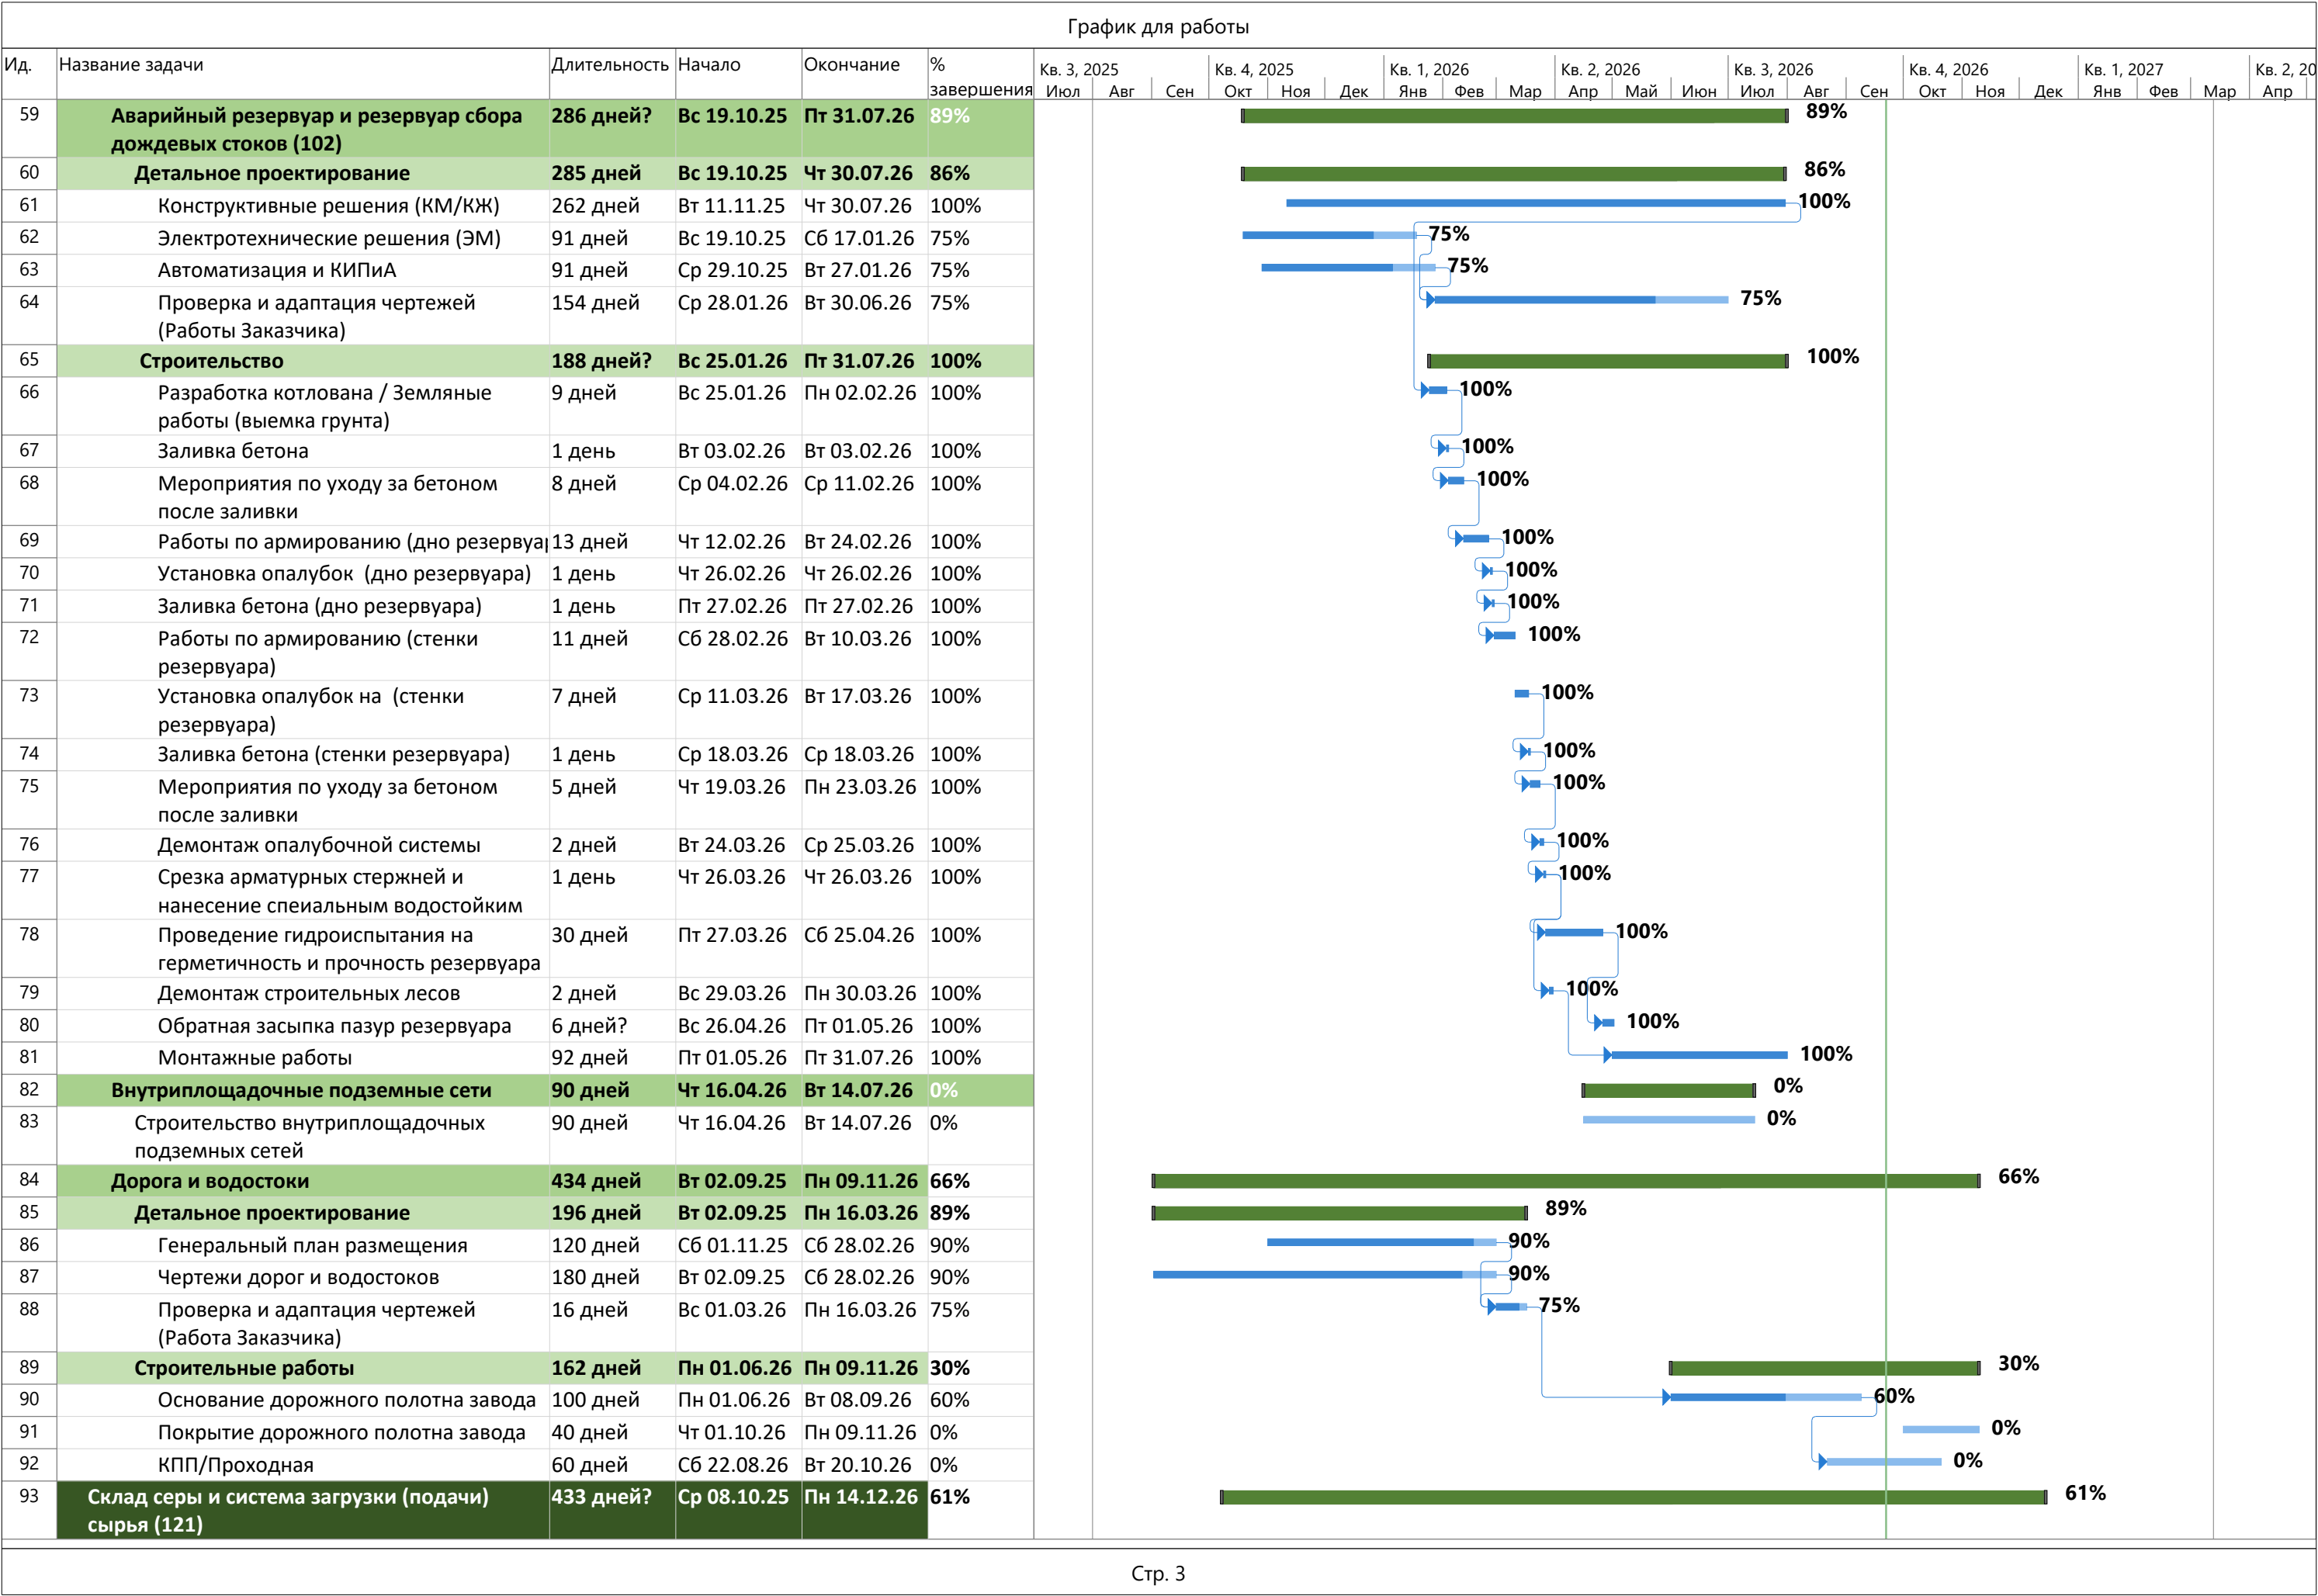


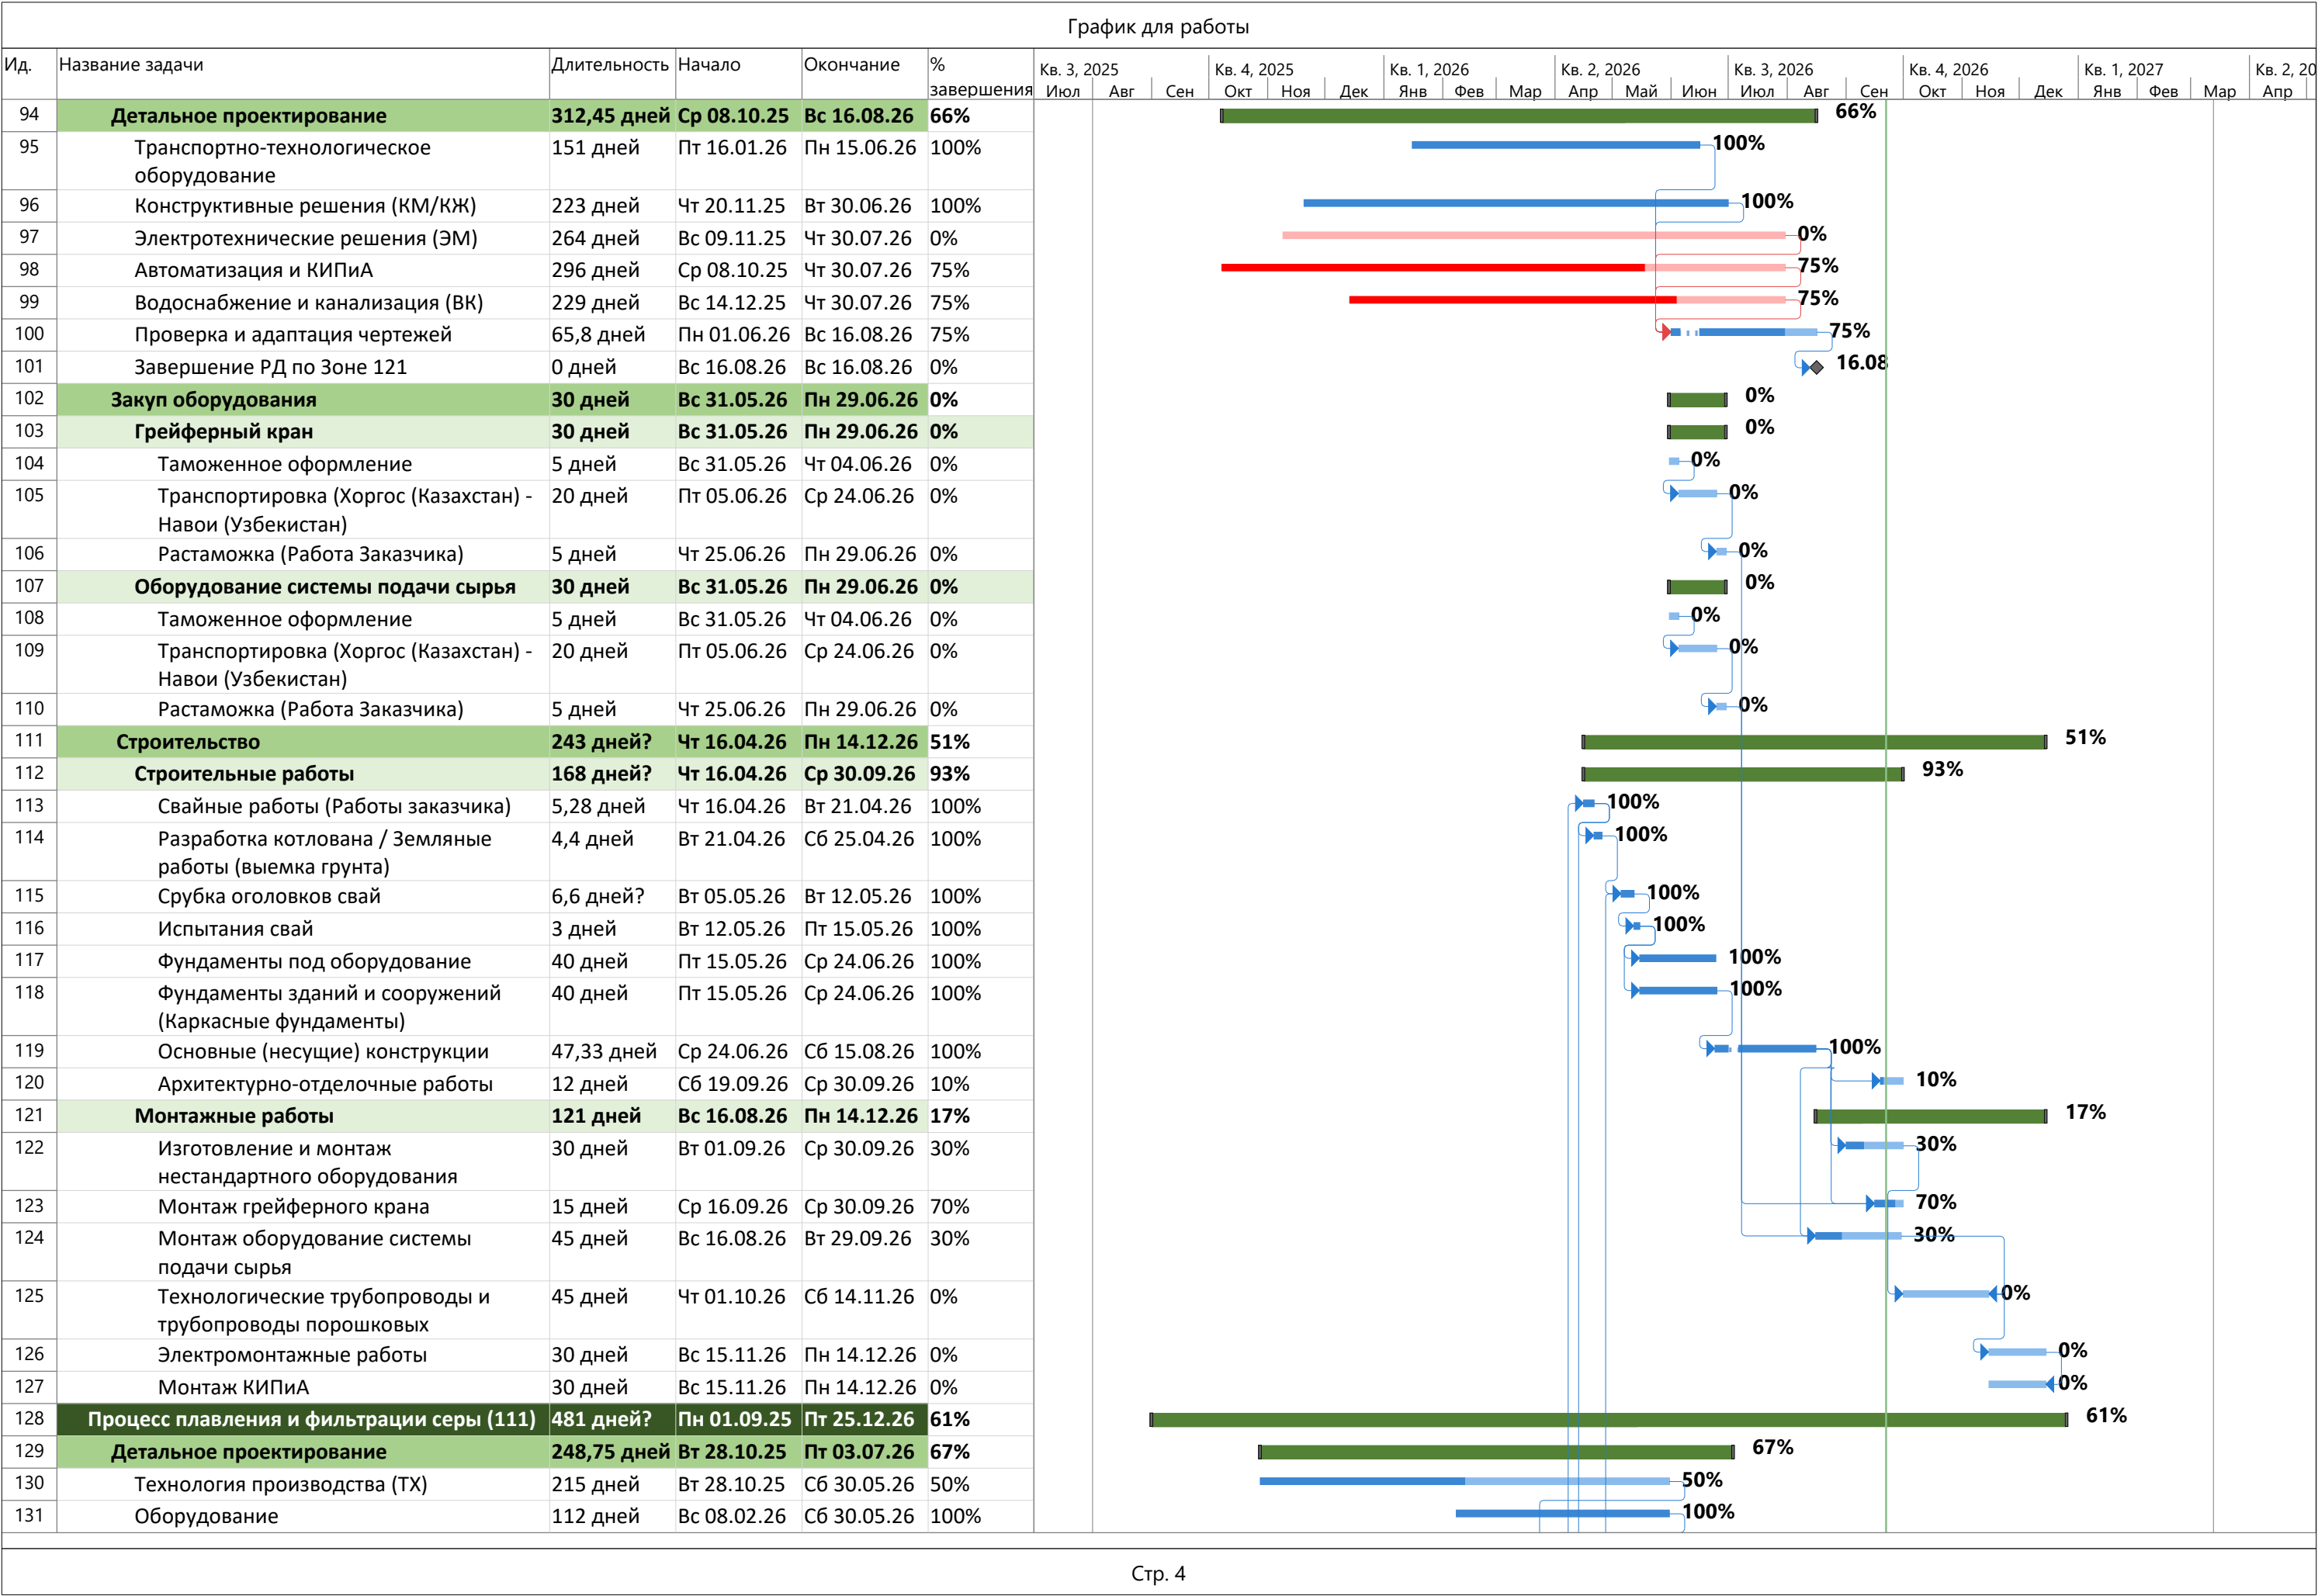


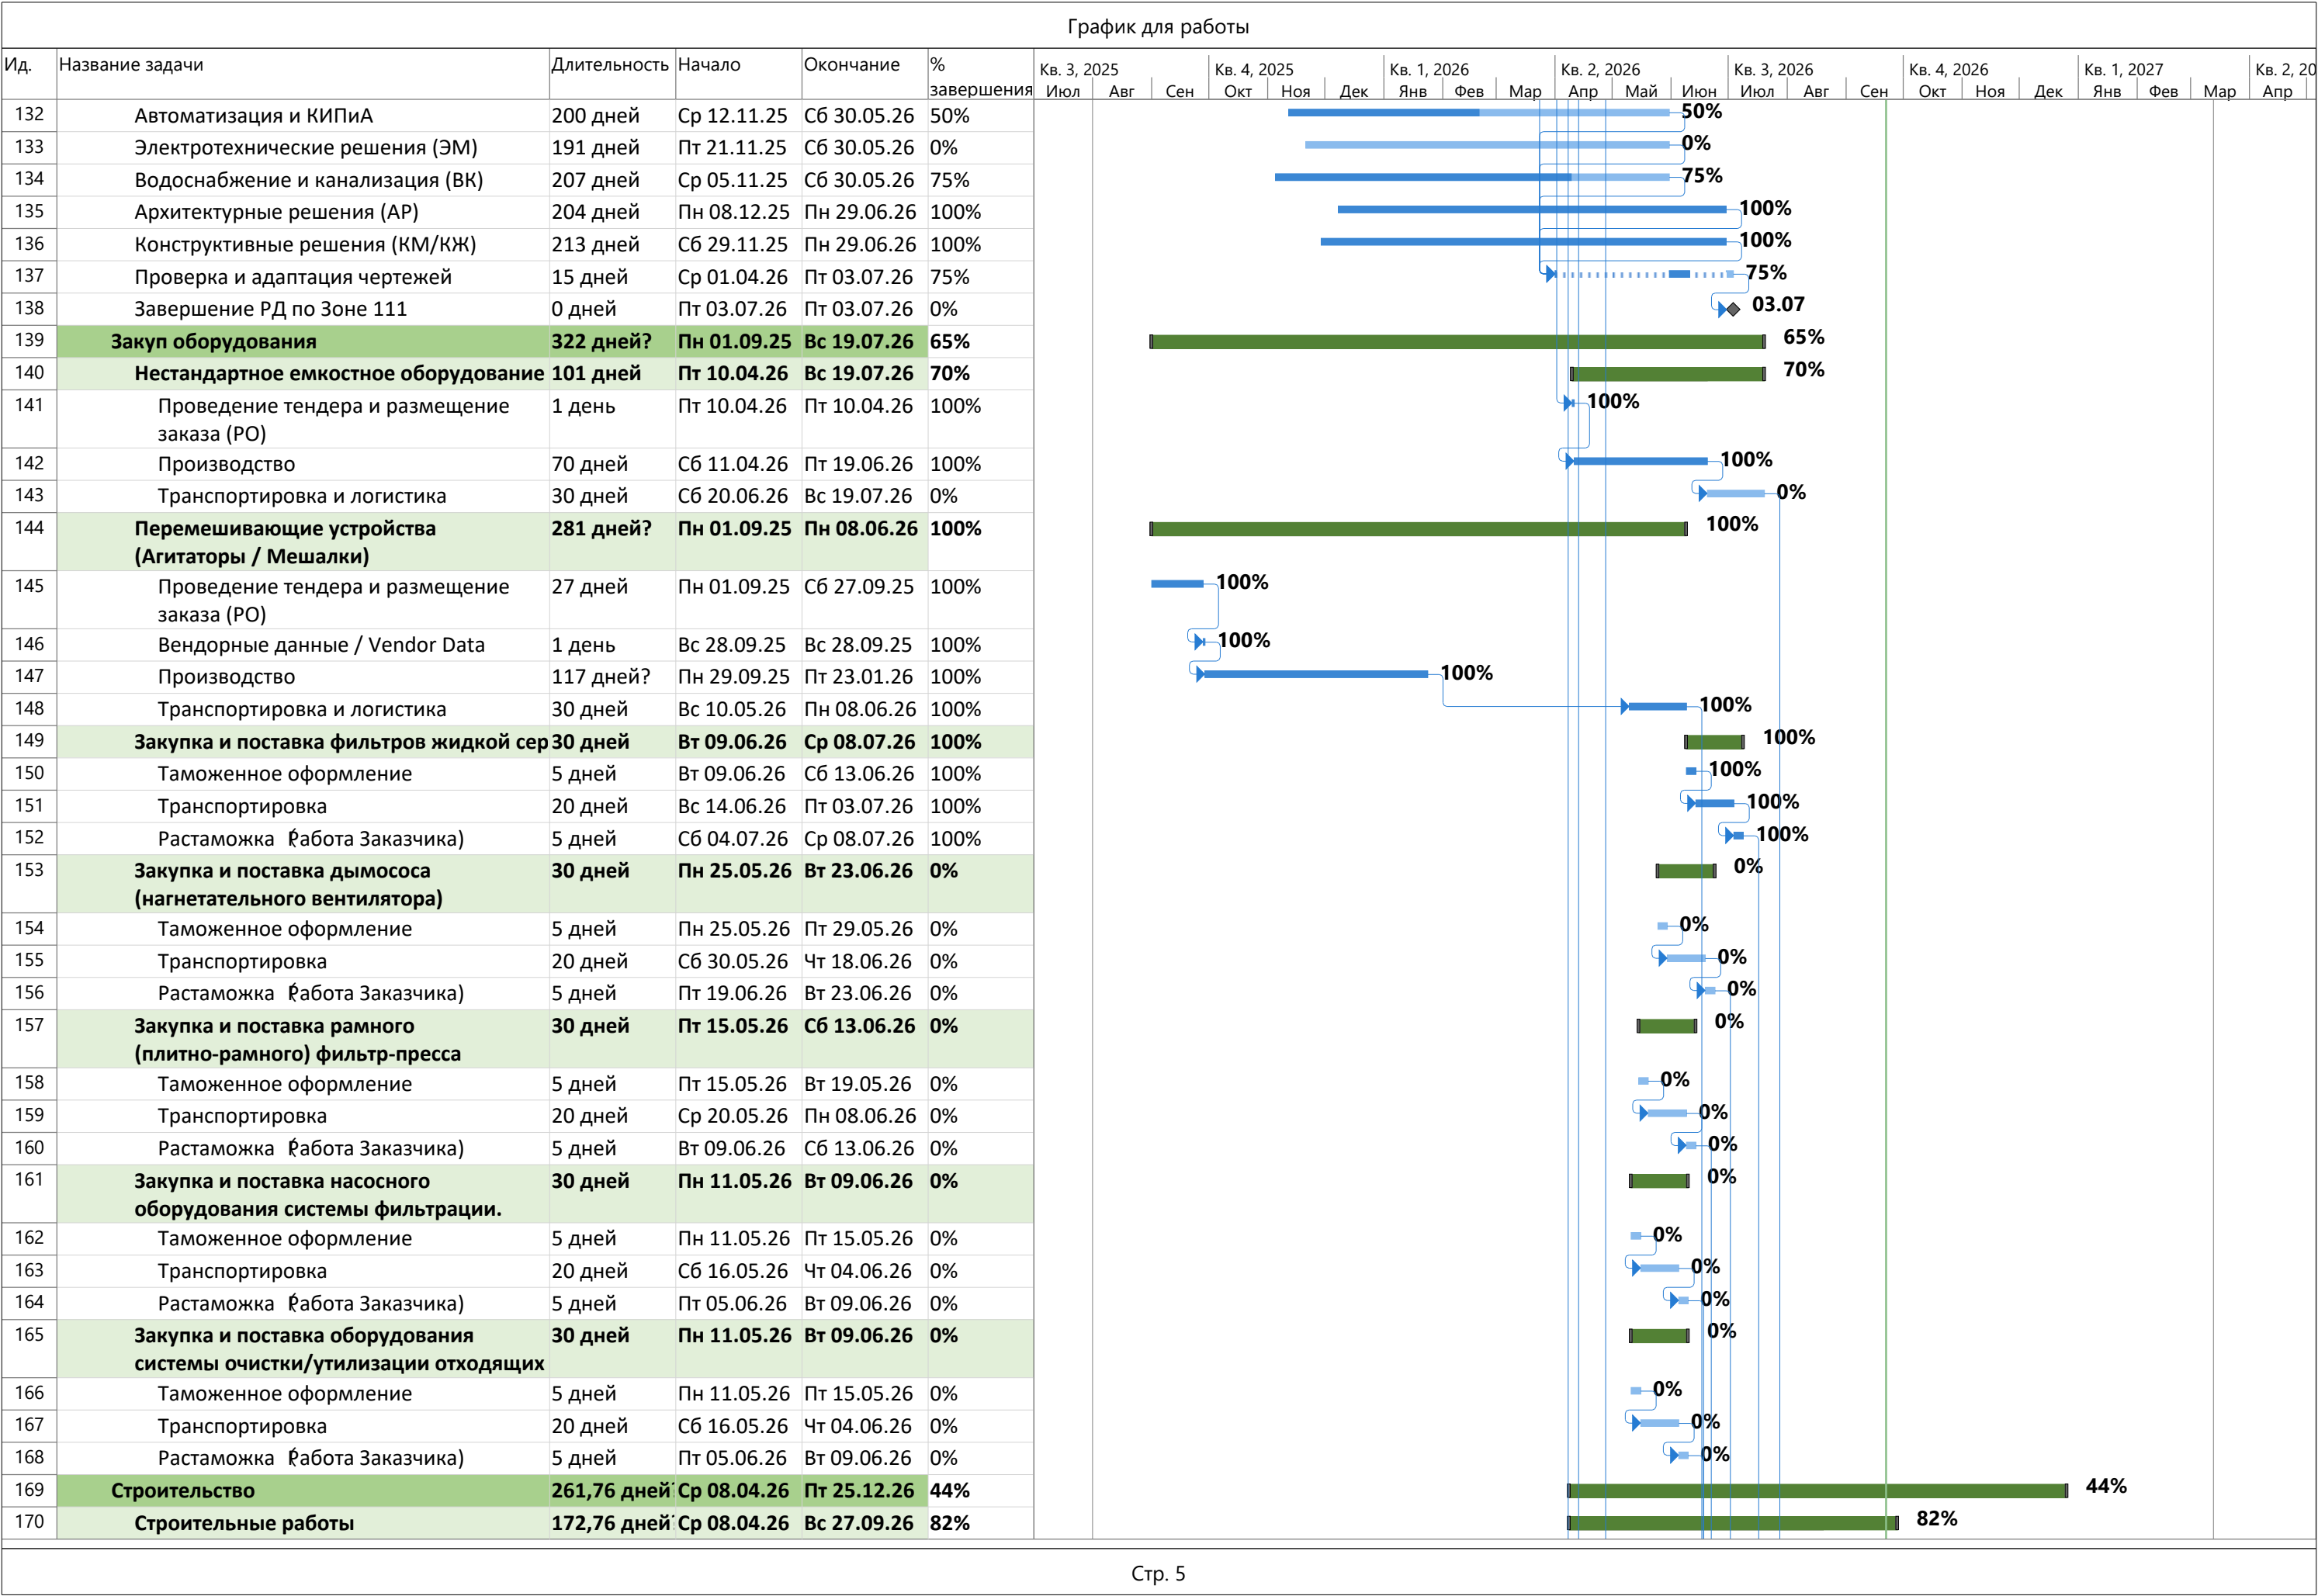


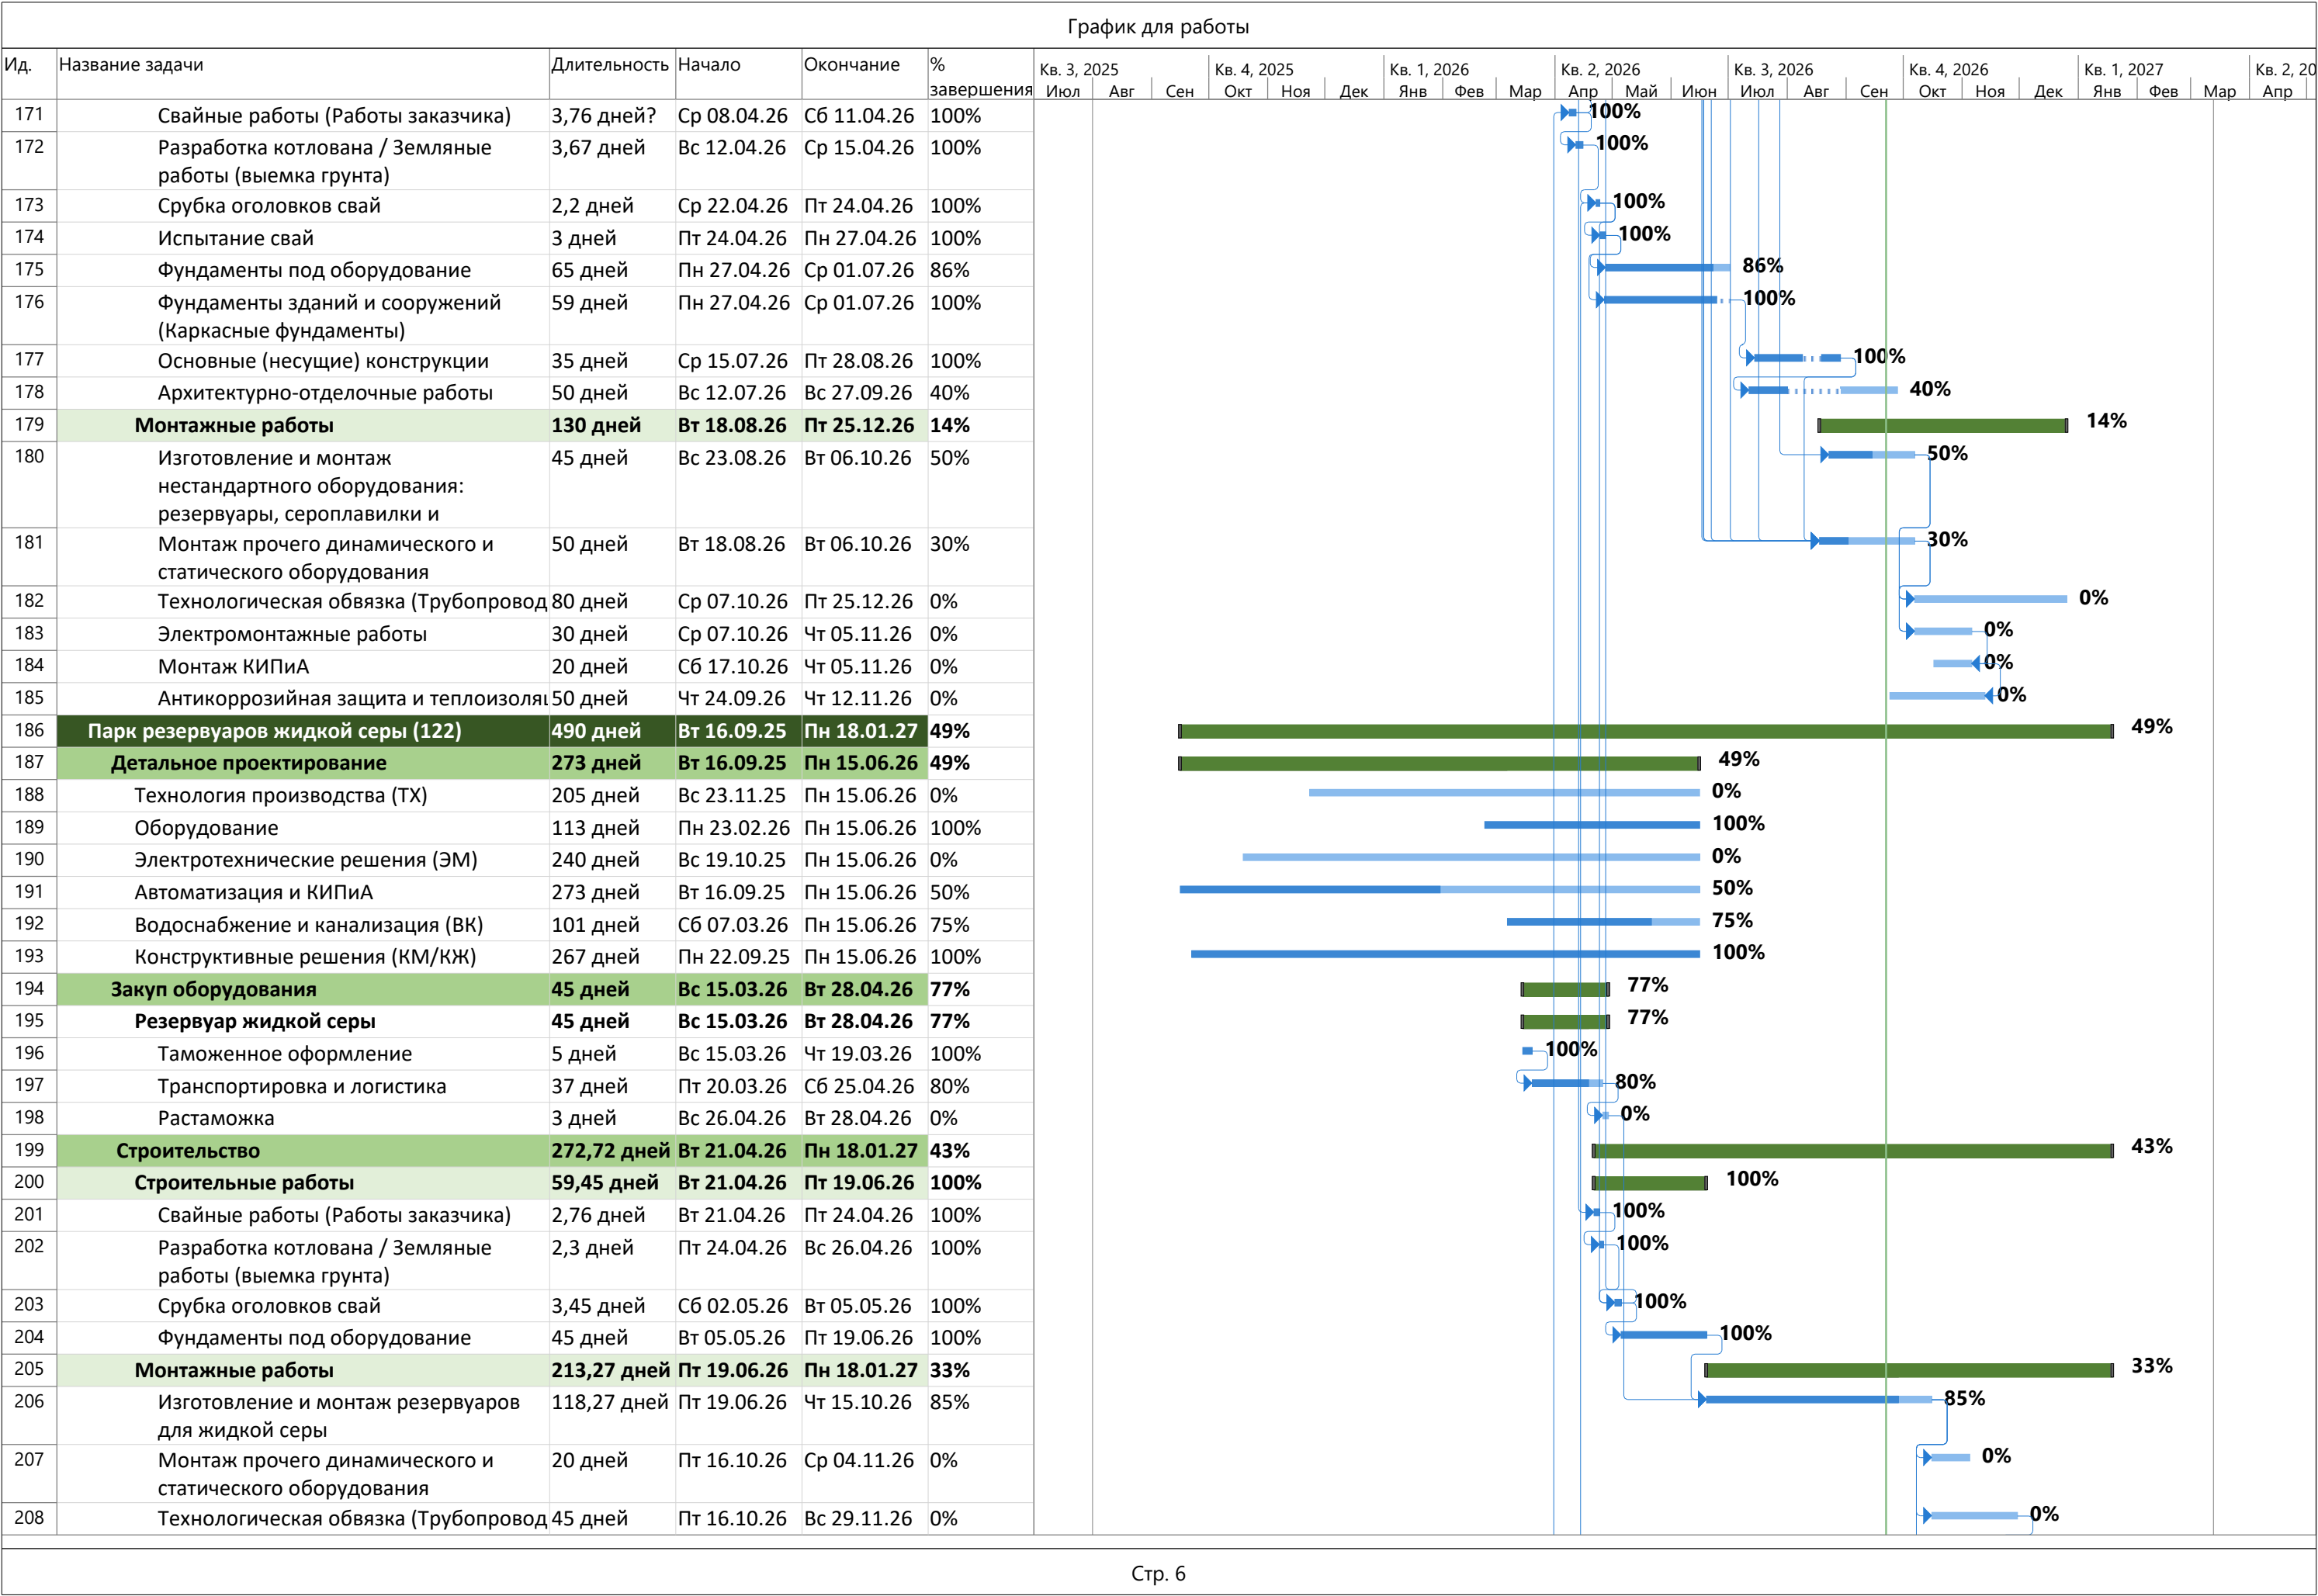


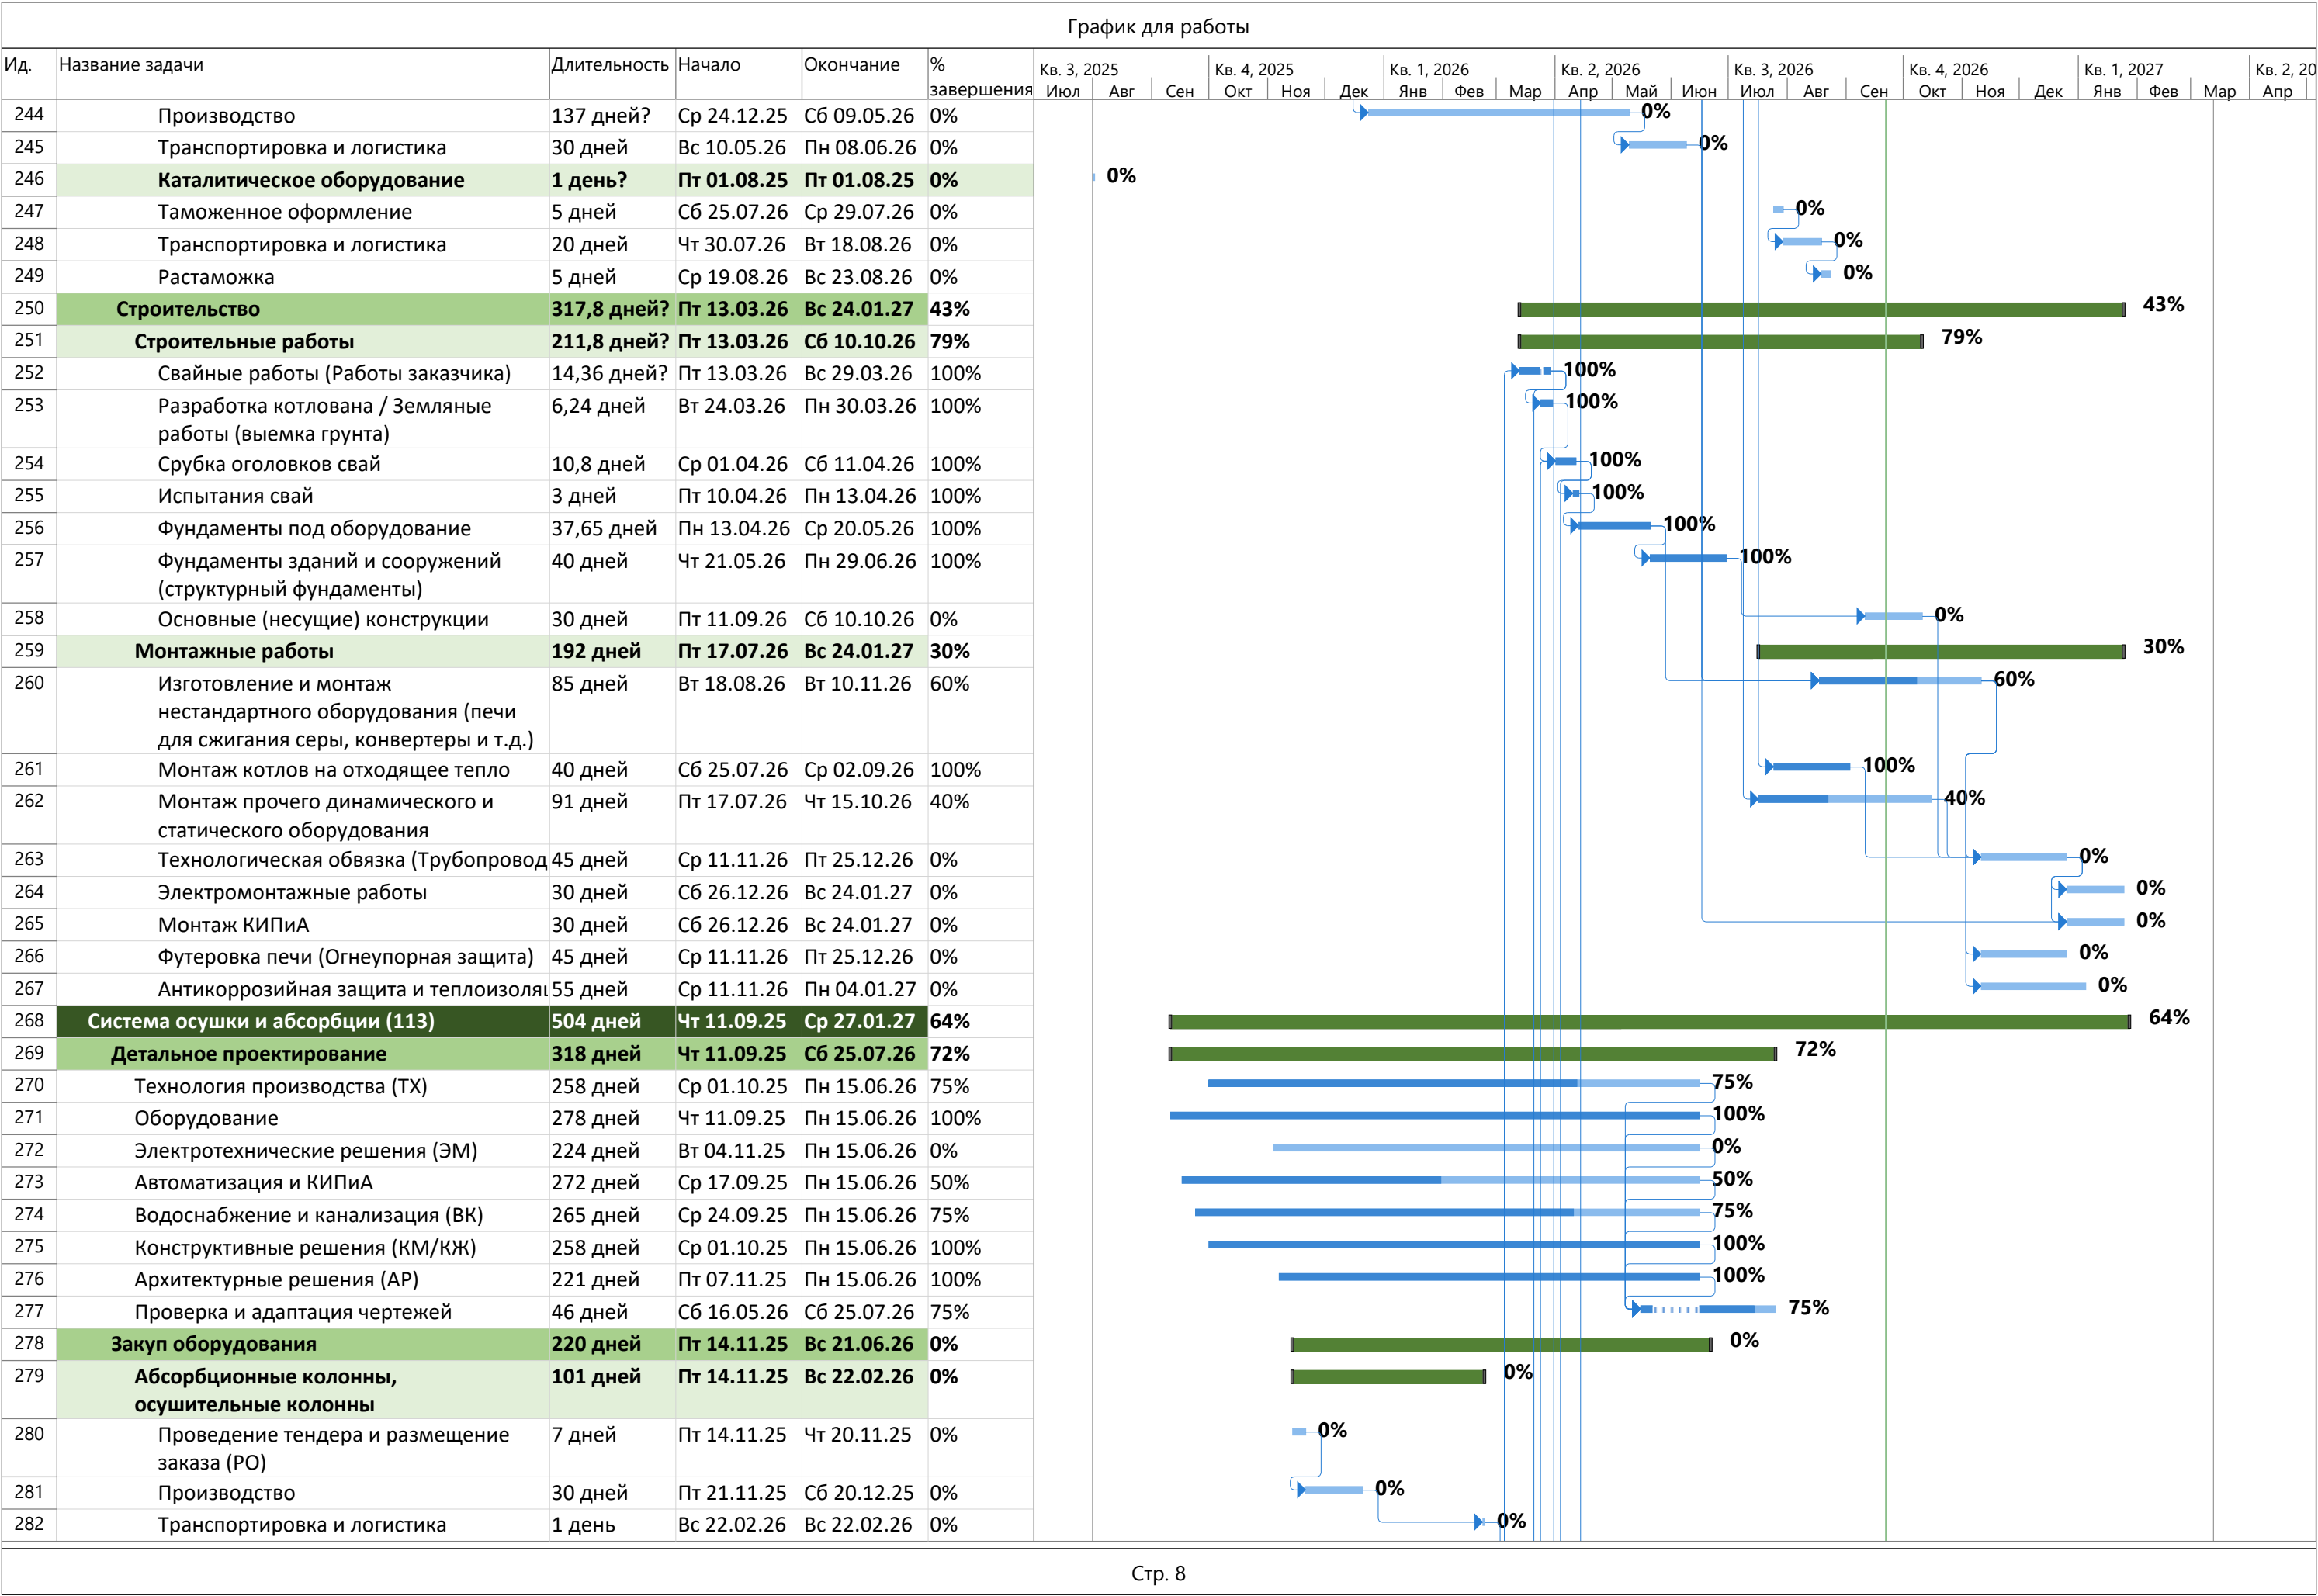


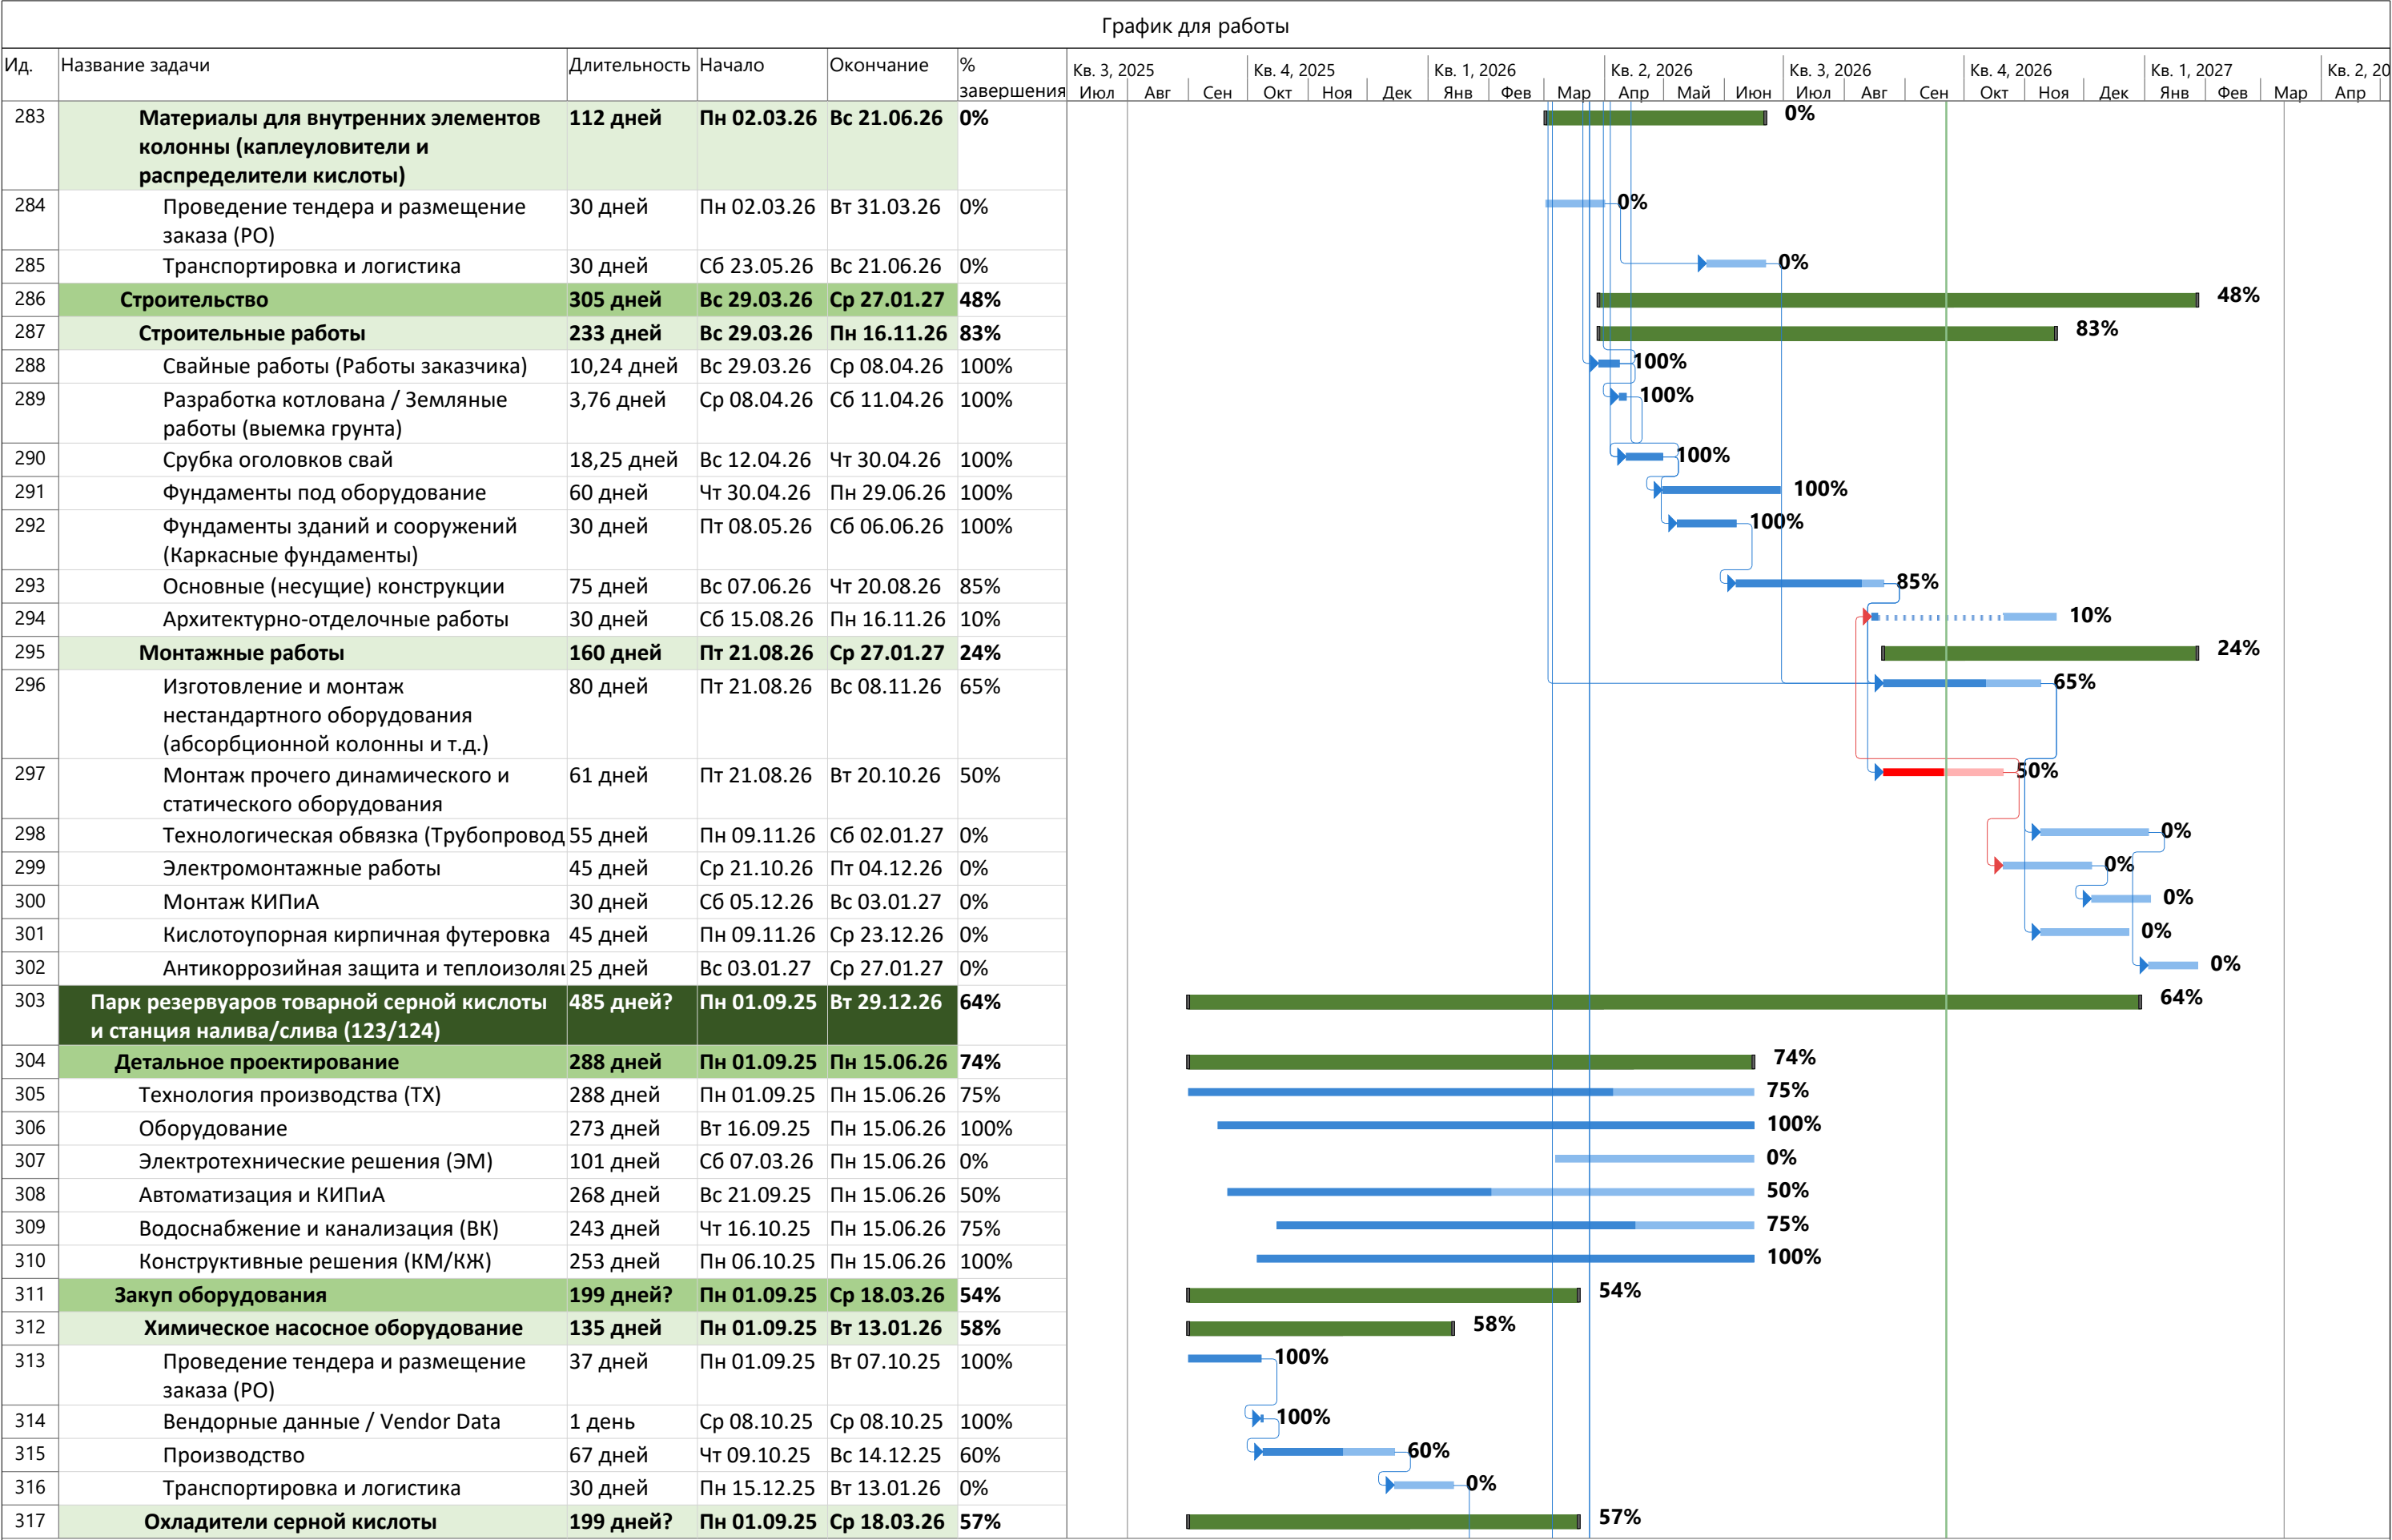


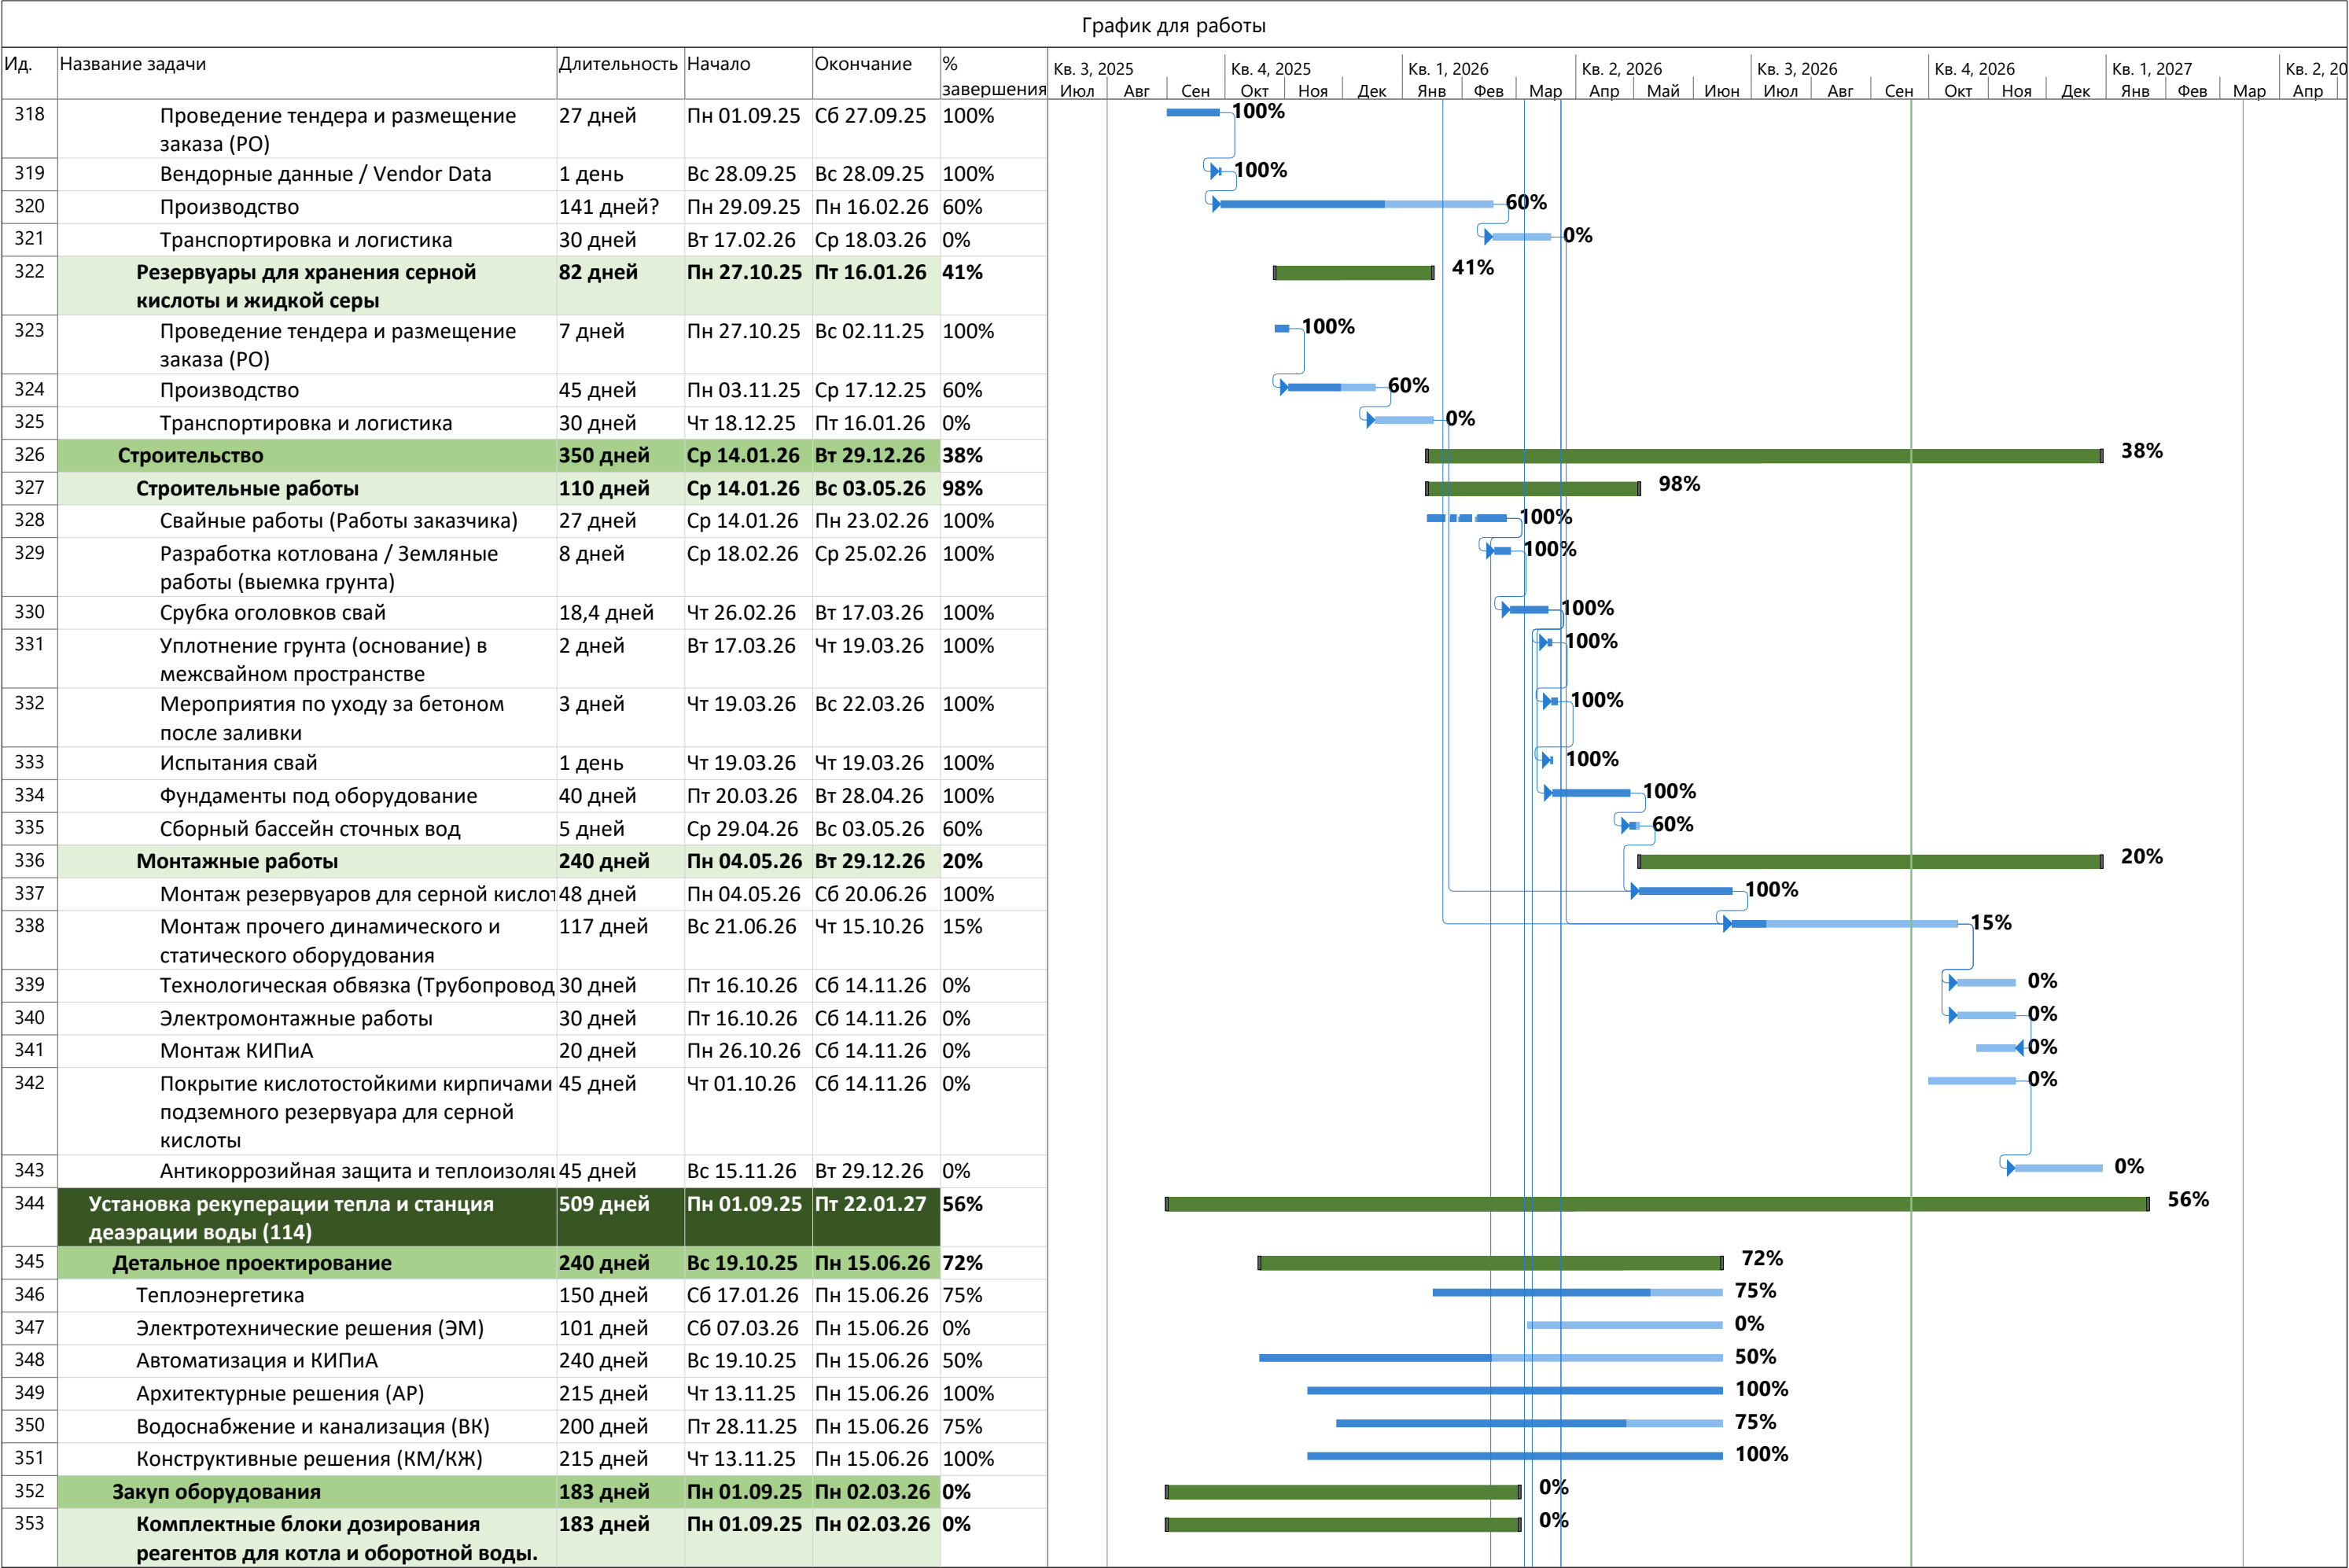


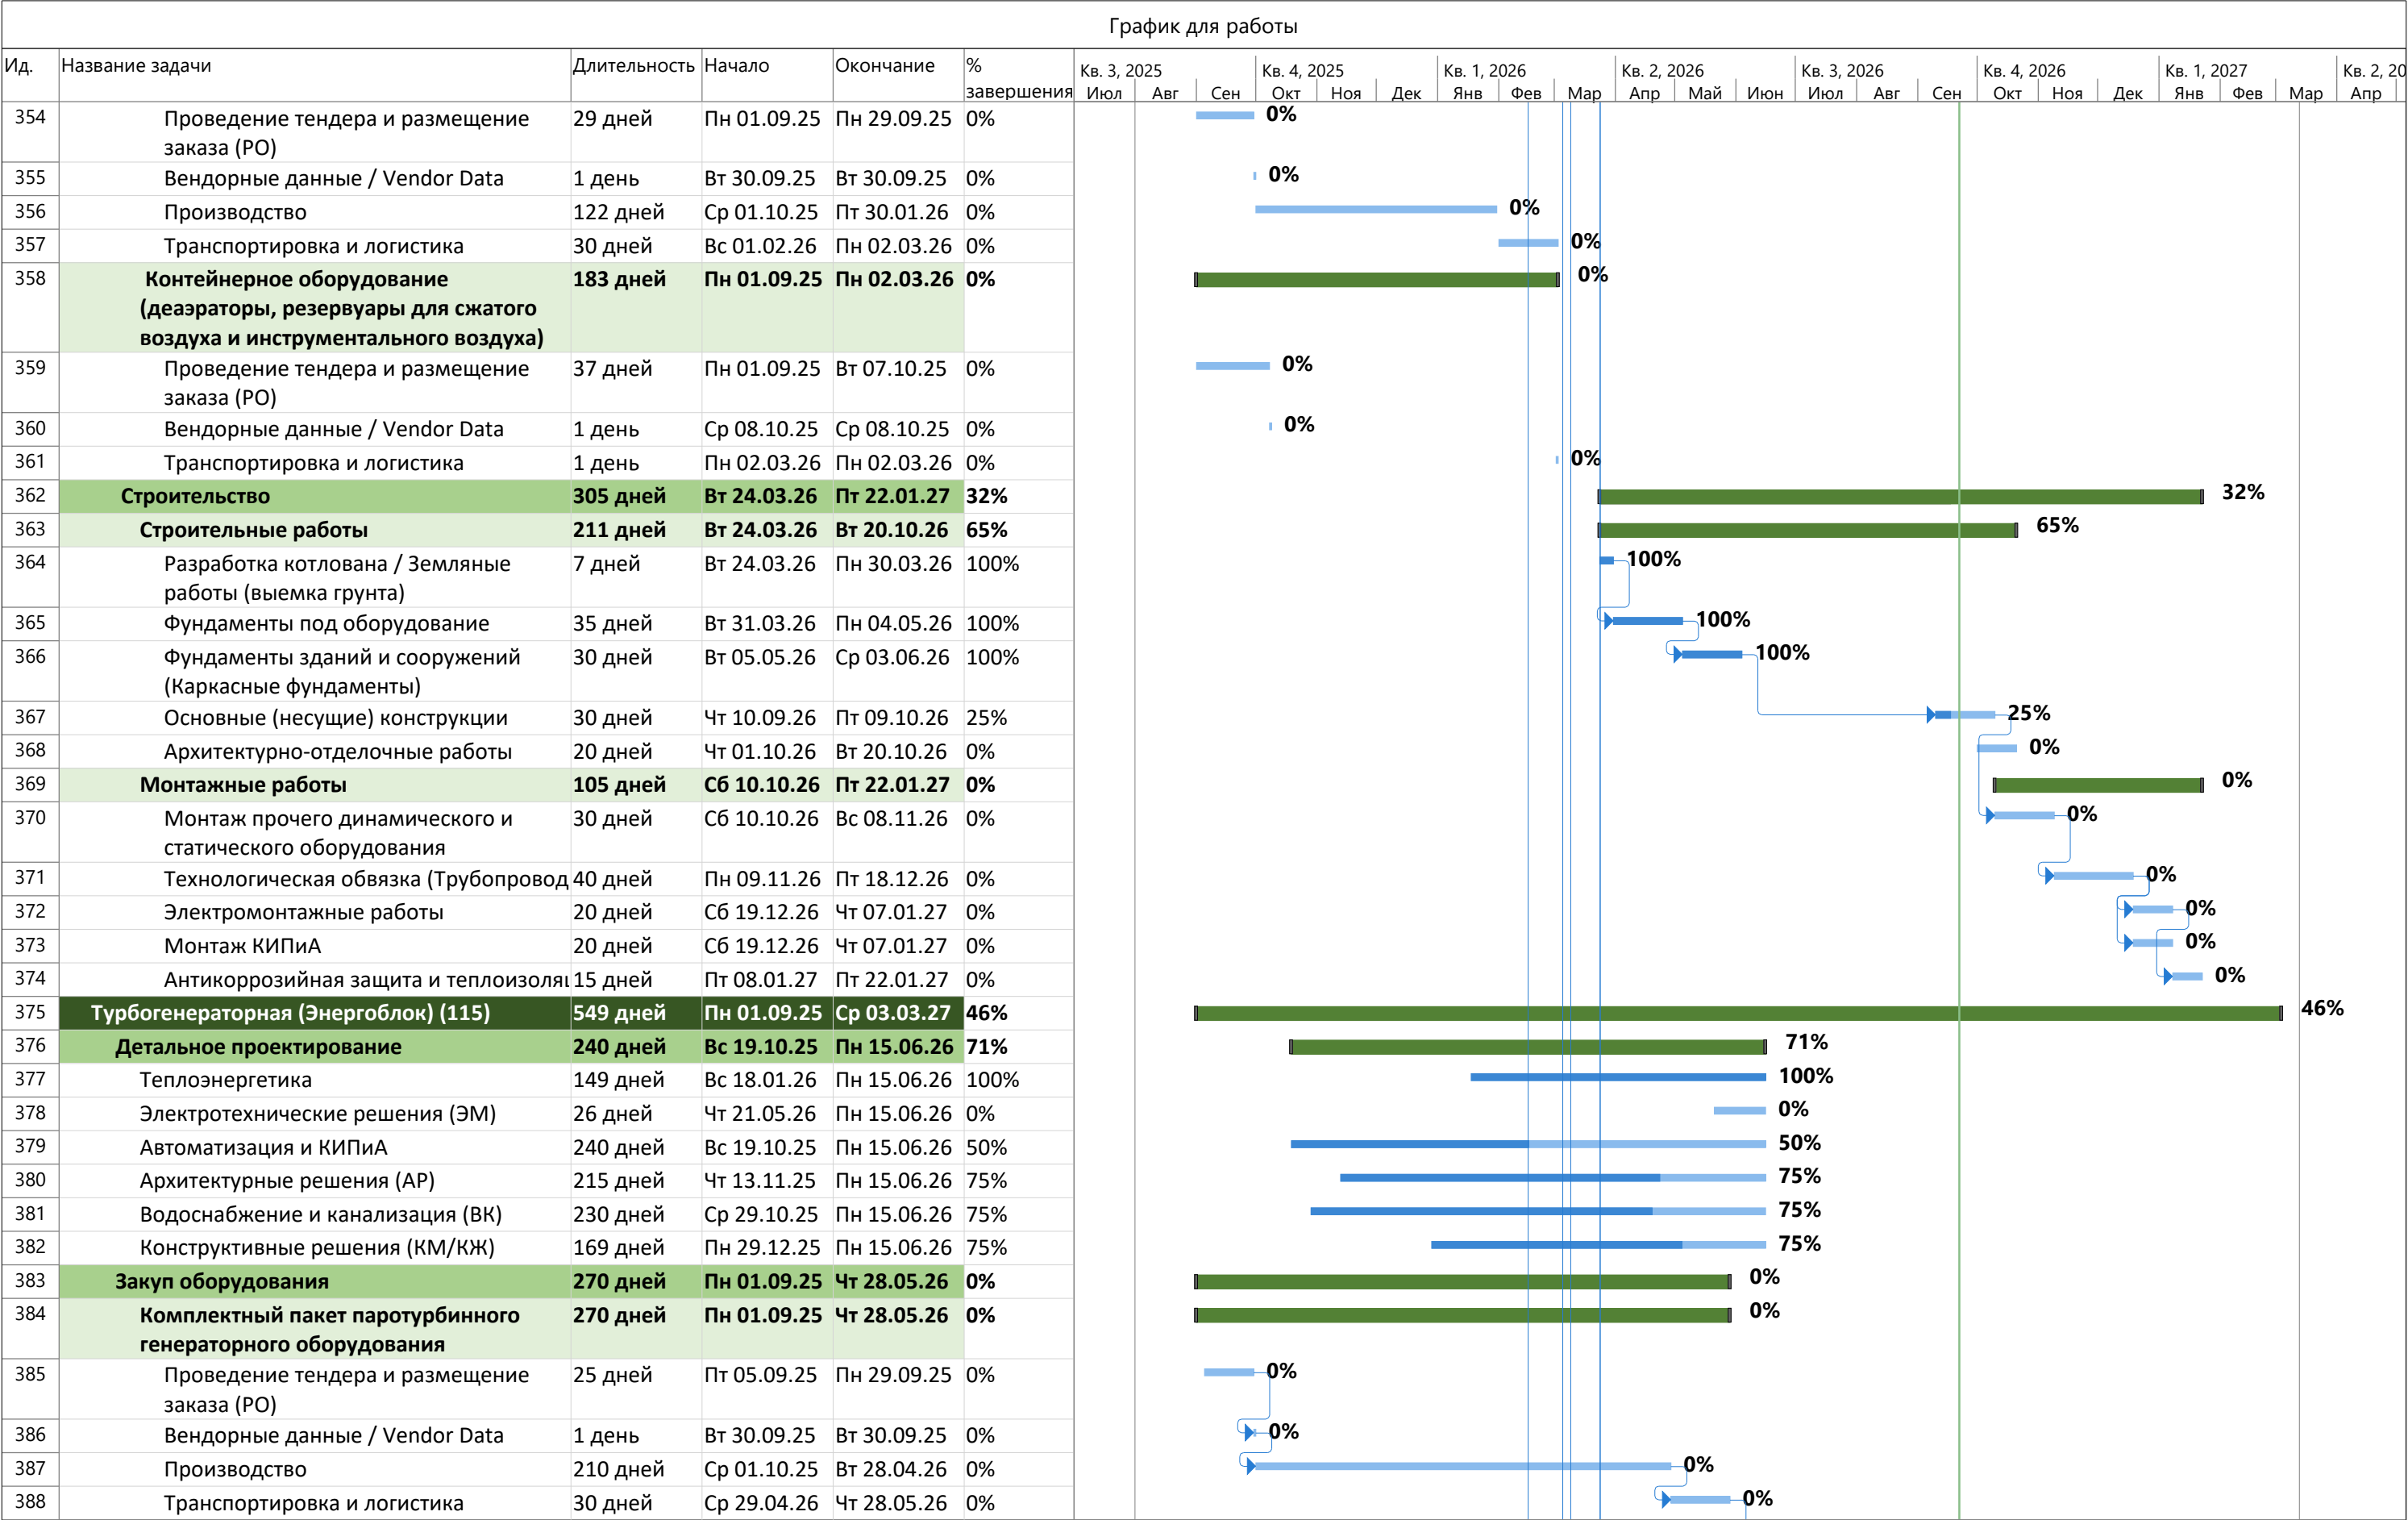

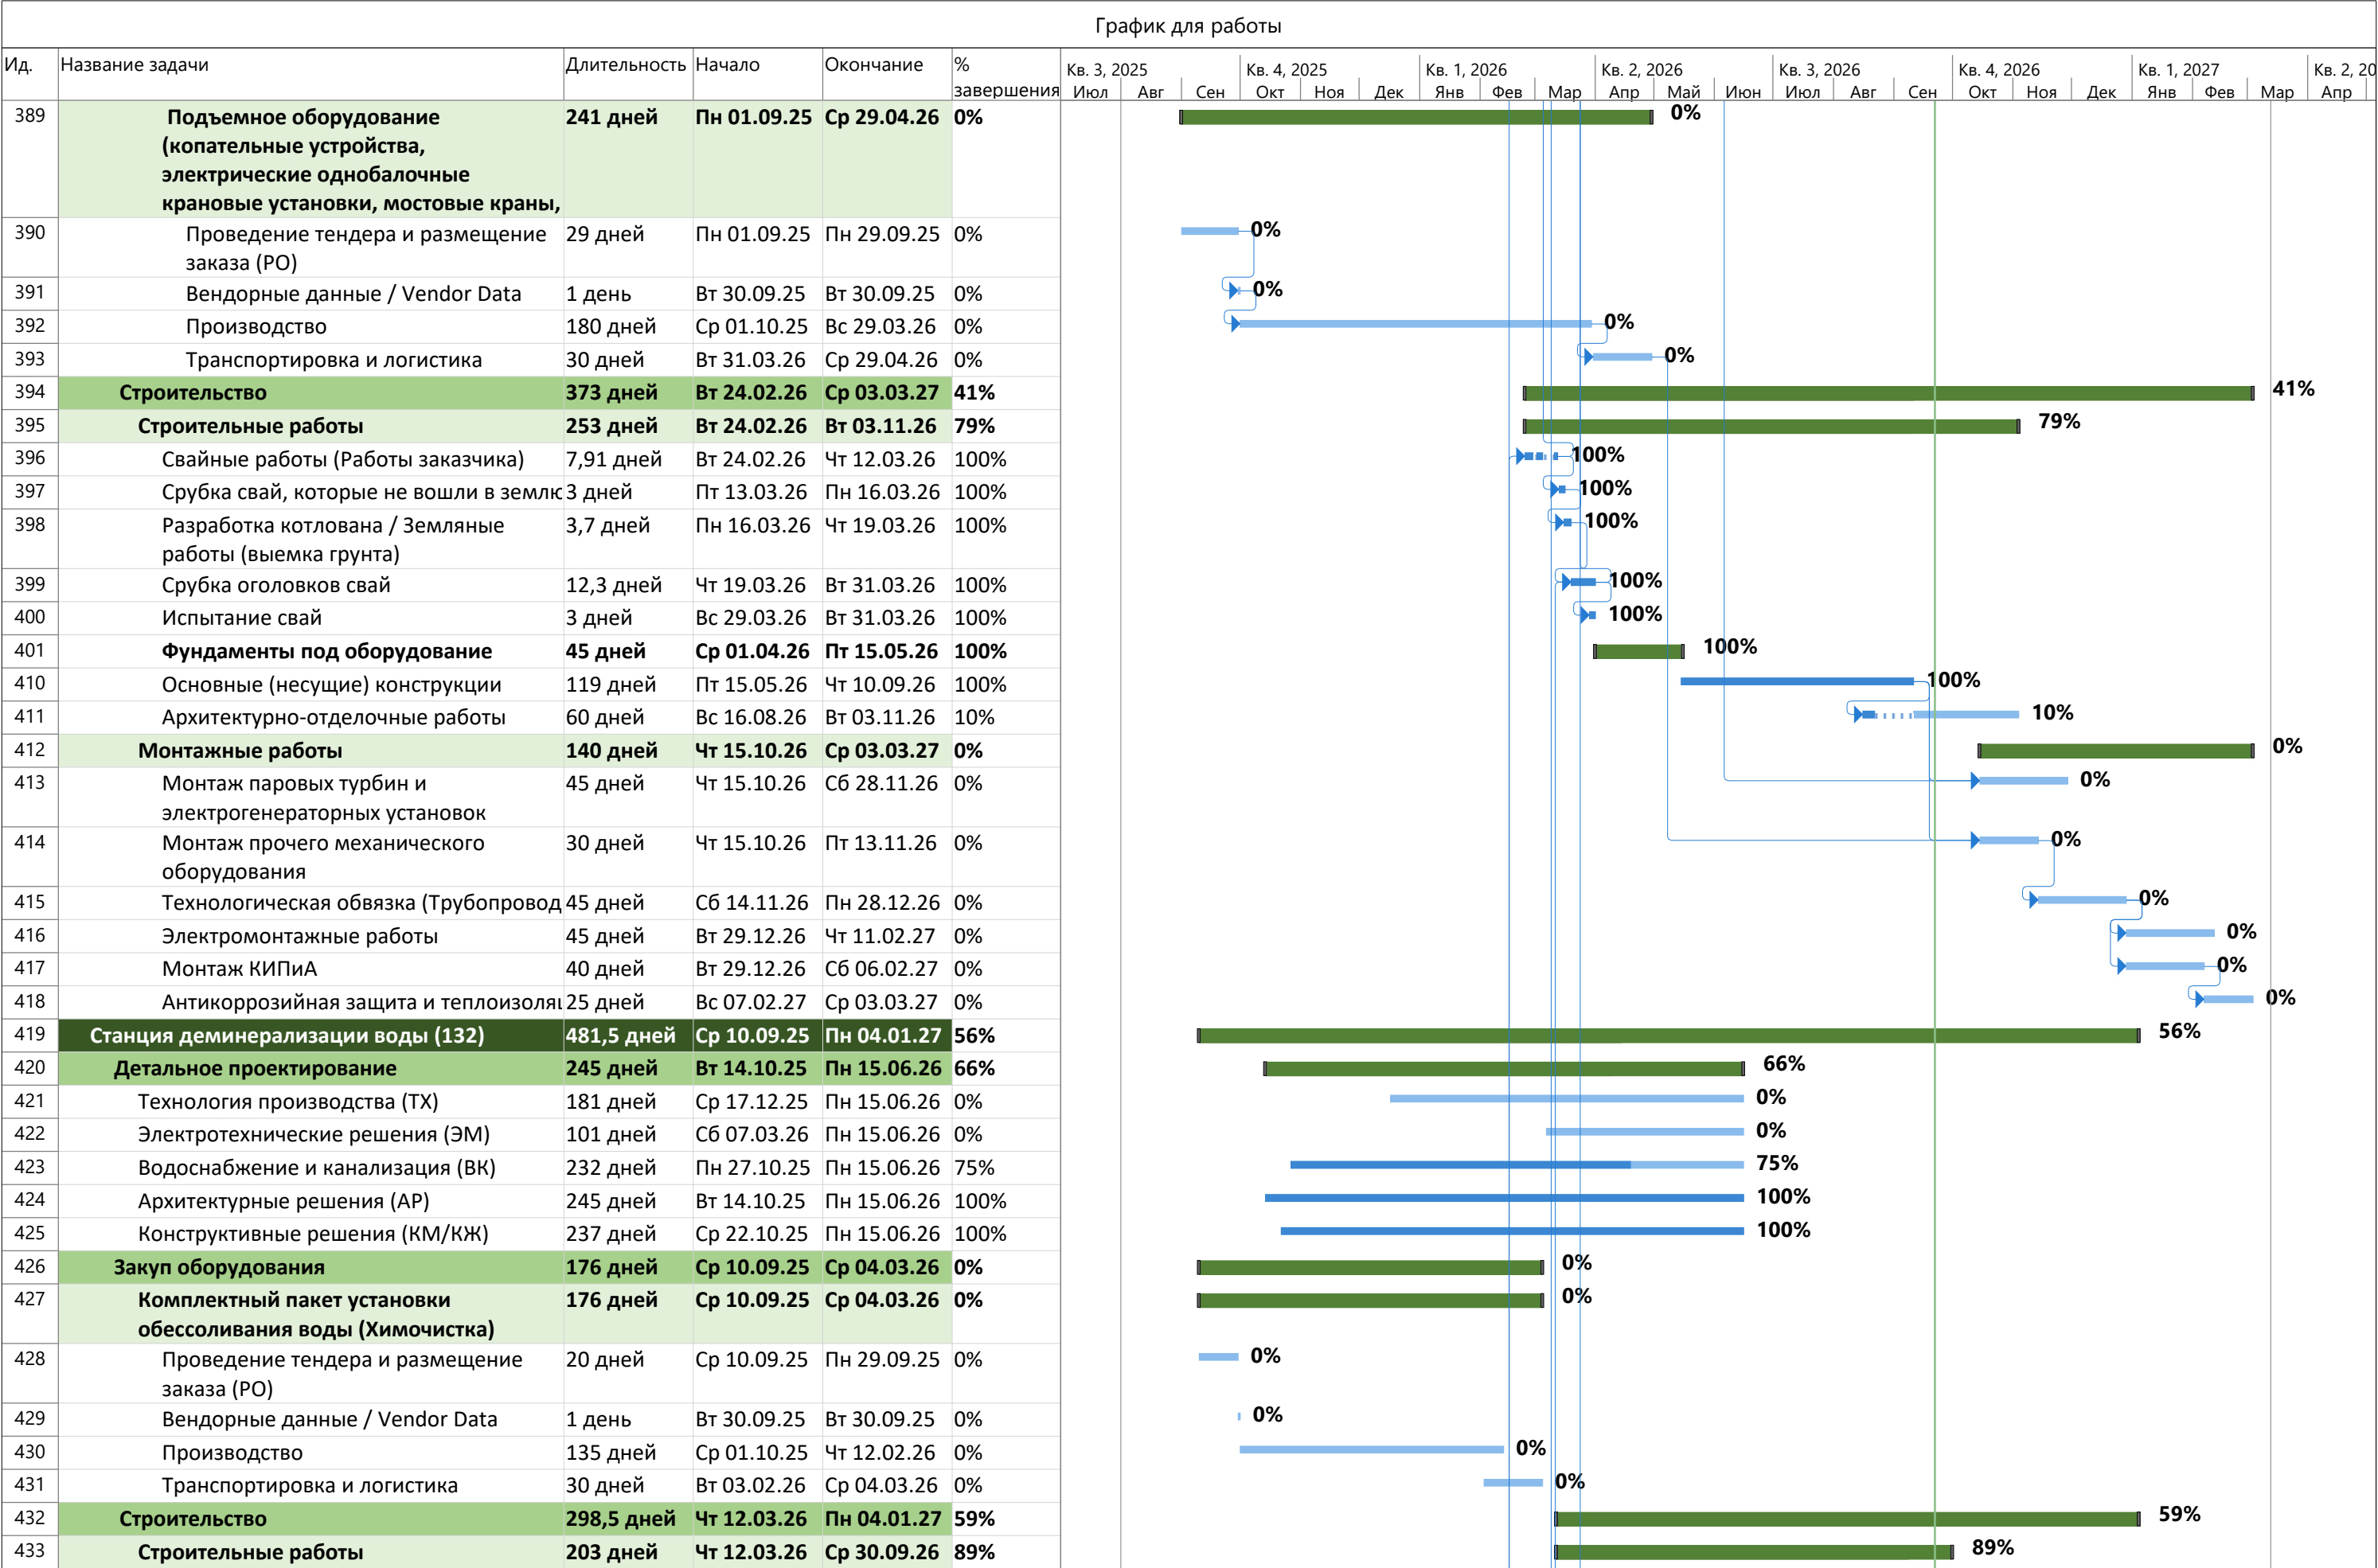

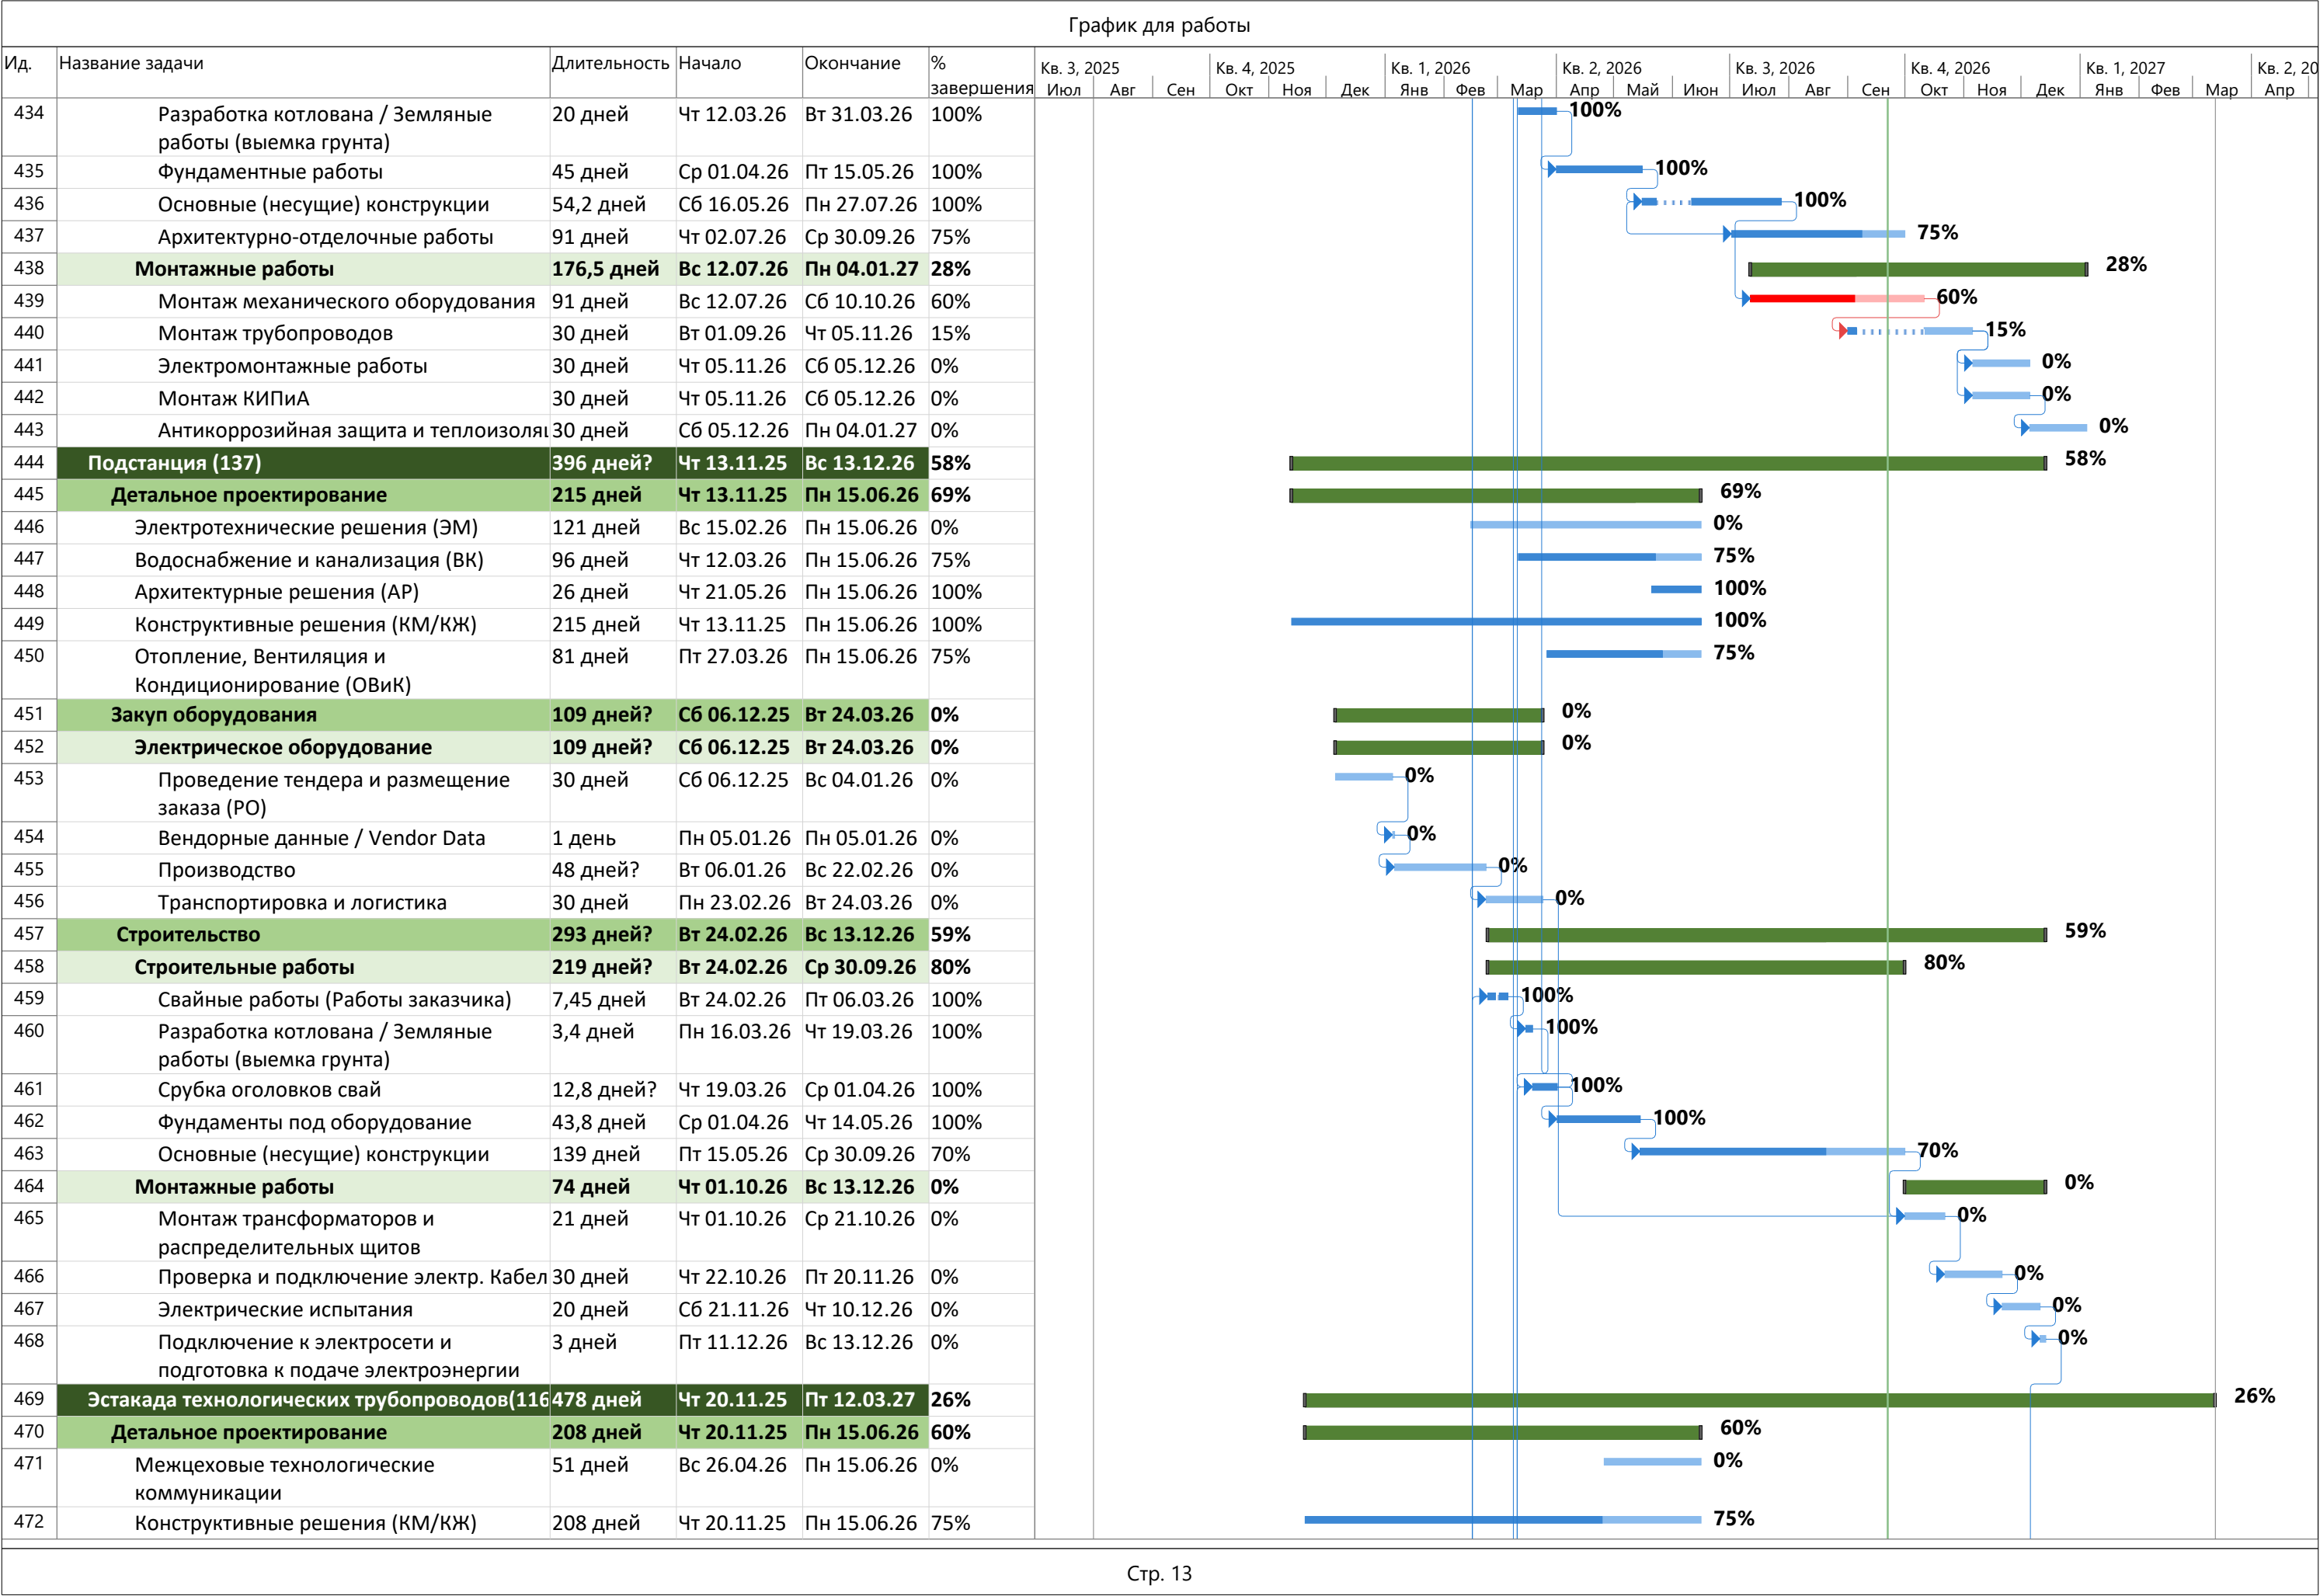

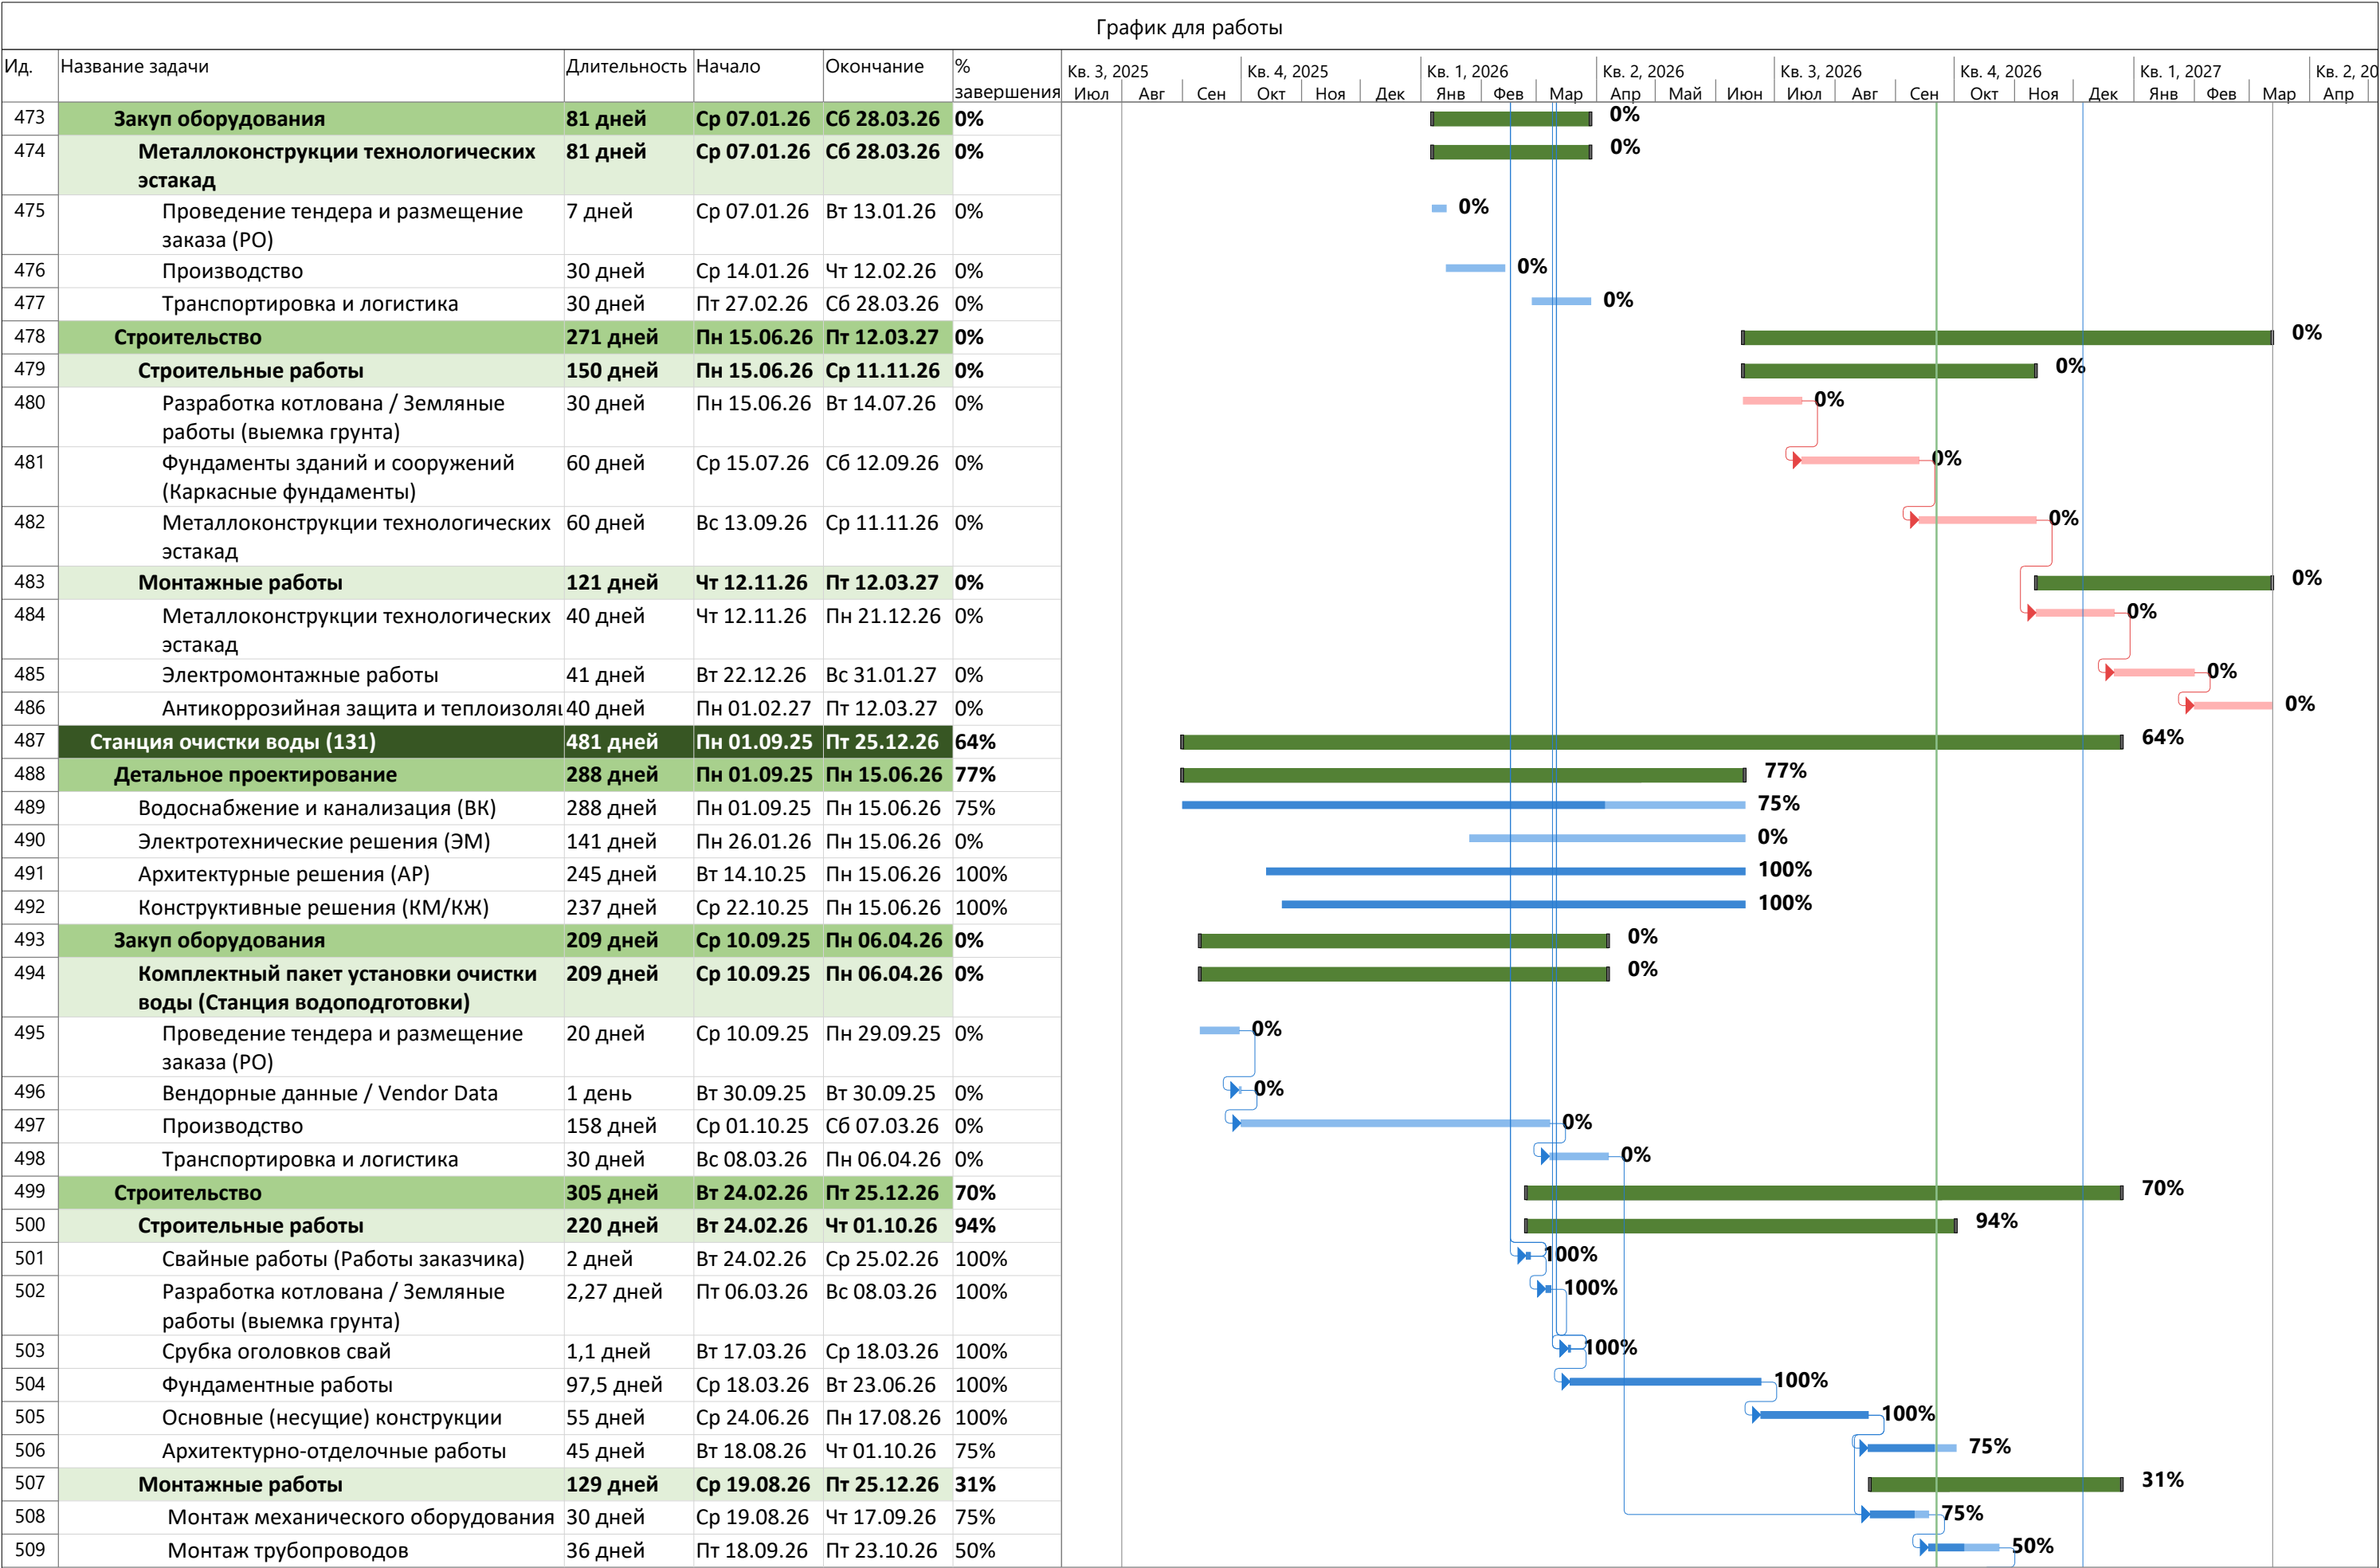

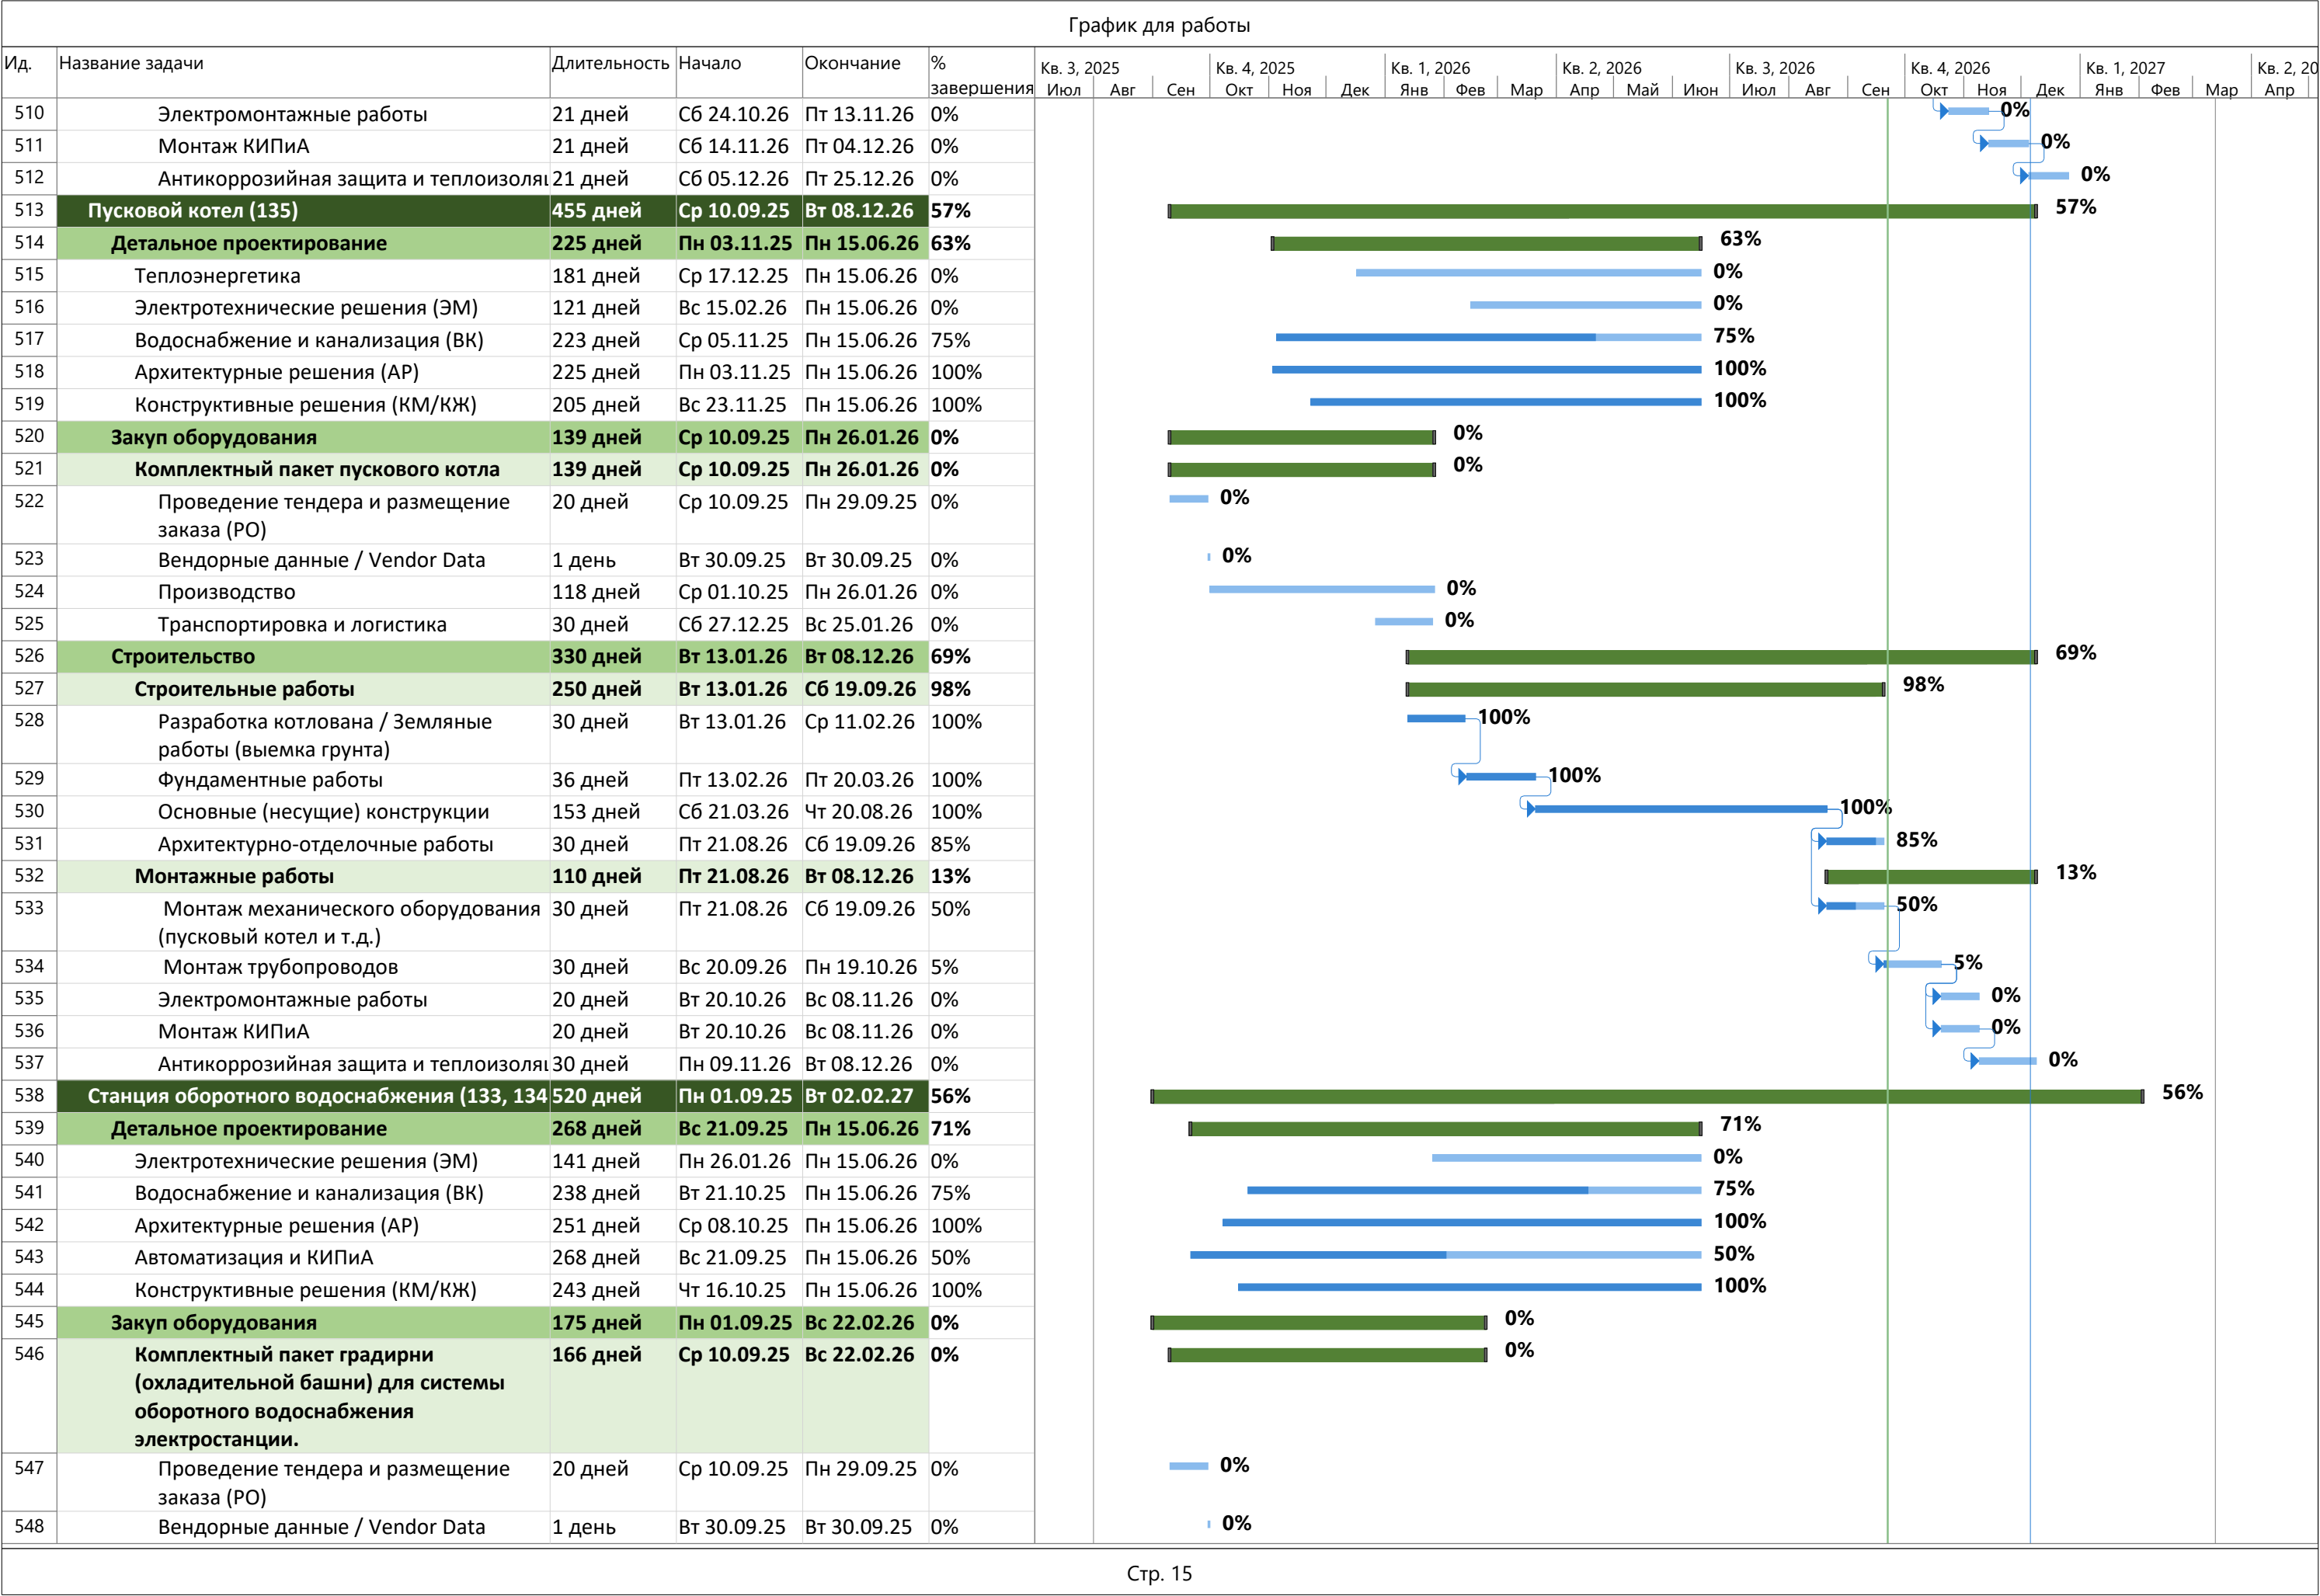

Стр. 15

График для работы																											
Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	% завершения	Кв. 3, 2025			Кв. 4, 2025			Кв. 1, 2026			Кв. 2, 2026			Кв. 3, 2026			Кв. 4, 2026			Кв. 1, 2027			Кв. 2, 2027
						Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр
549	Производство	124 дней	Ср 01.10.25	Вс 01.02.26	0%																						
550	Транспортировка и логистика	30 дней	Сб 24.01.26	Вс 22.02.26	0%																						
551	Насосное оборудование	175 дней	Пн 01.09.25	Вс 22.02.26	0%																						
552	Проведение тендера и размещение заказа (PO)	37 дней	Пн 01.09.25	Вт 07.10.25	0%																						
553	Вендорные данные / Vendor Data	1 день	Ср 08.10.25	Ср 08.10.25	0%																						
554	Производство	111 дней	Чт 09.10.25	Вт 27.01.26	0%																						
555	Транспортировка и логистика	30 дней	Сб 24.01.26	Вс 22.02.26	0%																						
556	Строительство	365 дней	Вт 03.02.26	Вт 02.02.27	61%																						
557	Строительные работы	255 дней	Вт 03.02.26	Чт 15.10.26	78%																						
558	Разработка котлована / Земляные работы (выемка грунта)	20 дней	Вт 03.02.26	Вс 22.02.26	100%																						
559	Фундаментные работы	203 дней	Пн 23.02.26	Вс 13.09.26	100%																						
560	Основные (несущие) конструкции	219 дней	Ср 11.03.26	Чт 15.10.26	70%																						
561	Архитектурно-отделочные работы	45 дней	Вт 01.09.26	Чт 15.10.26	5%																						
562	Монтажные работы	110 дней	Пт 16.10.26	Вт 02.02.27	0%																						
563	Монтаж механического оборудования	40 дней	Пт 16.10.26	Вт 24.11.26	0%																						
564	Монтаж трубопроводов	30 дней	Ср 25.11.26	Чт 24.12.26	0%																						
565	Электромонтажные работы	20 дней	Пт 25.12.26	Ср 13.01.27	0%																						
566	Монтаж КИПиА	20 дней	Пт 25.12.26	Ср 13.01.27	0%																						
567	Антикоррозийная защита и теплоизоляция	20 дней	Чт 14.01.27	Вт 02.02.27	0%																						
568	Компрессорная станция (136)	460 дней	Пн 01.09.25	Пт 04.12.26	34%																						
569	Детальное проектирование	181 дней	Пн 01.09.25	Сб 28.02.26	13%																						
570	Технология производства (ТХ)	181 дней	Пн 01.09.25	Сб 28.02.26	0%																						
571	Электротехнические решения (ЭМ)	141 дней	Пт 03.10.25	Пт 20.02.26	0%																						
572	Водоснабжение и канализация (ВК)	91 дней	Вт 28.10.25	Пн 26.01.26	25%																						
573	Архитектурные решения (АР)	21 дней	Ср 15.10.25	Вт 04.11.25	100%																						
574	Конструктивные решения (КМ/КЖ)	16 дней	Чт 23.10.25	Пт 07.11.25	100%																						
575	Закуп оборудования	147 дней	Пн 01.09.25	Вс 25.01.26	0%																						
576	Комплектный пакет закупки системы воздушных компрессоров	147 дней	Пн 01.09.25	Вс 25.01.26	0%																						
577	Проведение тендера и размещение заказа (PO)	27 дней	Пн 01.09.25	Сб 27.09.25	0%																						
578	Вендорные данные / Vendor Data	1 день	Вс 28.09.25	Вс 28.09.25	0%																						
579	Производство	119 дней	Вс 28.09.25	Сб 24.01.26	0%																						
580	Транспортировка и логистика	30 дней	Сб 27.12.25	Вс 25.01.26	0%																						
581	Строительство	326 дней	Вт 13.01.26	Пт 04.12.26	75%																						
582	Строительные работы	246 дней	Вт 13.01.26	Вт 15.09.26	94%																						
583	Разработка котлована / Земляные работы (выемка грунта)	34 дней	Вт 13.01.26	Вс 15.02.26	100%																						
584	Фундаментные работы	30 дней	Пн 16.02.26	Вт 17.03.26	100%																						
585	Основные (несущие) конструкции	70 дней	Вт 17.03.26	Пн 25.05.26	100%																						
586	Архитектурно-отделочные работы	85 дней	Вт 23.06.26	Вт 15.09.26	85%																						
587	Монтажные работы	126 дней	Сб 01.08.26	Пт 04.12.26	46%																						
588	Монтаж механического оборудования (компрессоры и т.д.)	46 дней	Сб 01.08.26	Вт 15.09.26	100%																						

Стр. 16

